



Komunalno društvo  
**VODOVOD I KANALIZACIJA** d.o.o.  
za vodoopskrbu i odvodnju Rijeka

Dolac 14, 51000 Rijeka  
MB 3331903 OIB 80805858278

T: (051) 353 222 F: (051) 353 207  
E: [kdvik-rijeka@kdvik-rijeka.hr](mailto:kdvik-rijeka@kdvik-rijeka.hr)  
[www.kd vik-rijeka.hr](http://www.kd vik-rijeka.hr)

**GRADNJA KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA I  
KORIŠTENJE SREDSTAVA NAKNADE ZA RAZVOJ TE  
OSTALIH IZVORA FINANCIRANJA**

***IZVJEŠTAJ ZA 2015. GODINU***

Rijeka, travanj 2016.

## SADRŽAJ

8. GRADNJA KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA I KORIŠTENJE SREDSTAVA NAKNADE ZA RAZVOJ TE OSTALIH IZVORA FINANCIRANJA .....	3
8.1. RAZVOJNI ZAHVATI VODOOPSKRBE I ODVODNJE OTPADNIH VODA OD ZAJEDNIČKOG INTERESA SUVLASNIKA DRUŠTVA I ISPORUČITELJA VODNE USLUGE (I PRIORITET).....	5
8.2. ULAGANJA U PROJEKTE VODOOPSKRBE I ODVODNJE OD INTERESA ZA JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE FINANCIRANI IZ PRIPADAJUĆEG PREOSTALOG DIJELA NAKNADE ZA RAZVOJ I OSTALIH IZVORA (II PRIORITET) .....	8
8.2.1. FINANCIRANJE RAZVOJNIH ZAHVATA VODOOPSKRBE I ODVODNJE OTPADNIH VODA PUTEM EUROPSKE BANKE ZA OBNOVU I RAZVOJ (EBRD) .....	27
8.2.2. FINANCIRANJE HRVATSKIH VODA PUTEM EIB - CEB PROGRAMA.....	28
SAŽETAK .....	29

## 8. GRADNJA KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA I KORIŠTENJE SREDSTAVA NAKNADE ZA RAZVOJ TE OSTALIH IZVORA FINANCIRANJA

Gradnja komunalnih vodnih građevina obuhvaća: projekte vodoopskrbe i odvodnje od zajedničkog interesa suvlasnika Društva i od značaja za funkcioniranje i unapređenje sustava vodoopskrbe i odvodnje financirane iz naknade za razvoj i ostalih izvora (I PRIORITET) te projekte vodoopskrbe i odvodnje od interesa za jedinice lokalne samouprave financirane iz pripadajućeg preostalog dijela naknade za razvoj i ostalih izvora (II PRIORITET).

U sljedećoj tablici daje se rekapitulacija ulaganja za 2015.g. u gradnju komunalnih vodnih građevina po izvorima financiranja za projekte I i II prioriteta.


Tablica 1: REKAPITULACIJA OSTVARENIH ULAGANJA U PROJEKTE I i II PRIORITETA PO IZVORIMA FINANCIRANJA ZA 2015. GODINU U USPOREDBI S IZMJENAMA PLANA ZA 2015. GODINU

(u kn bez lipa)

Opis		Izvori financiranja					Ukupno	
		Naknada za razvoj vodoopskrbe i odvodnje	Naknada za razvoj kanaliz. sustava Grobnik - Klana	Proračun	Hrvatske vode - Jadranski projekt (zajam, drž. proračun, HV)	Hrvatske vode		Drugi izvor financiranja (kredit)
		1	2	3	4	5	6	7 (1+2+3+4+5+6)
Projekti I prioriteta	Izmjene Plana 2015.	14.646.120	6.112.000	-	14.100.000	16.503.590	-	<b>51.361.710</b>
	Ostvarenje 2015.	11.499.094	5.899.781	-	13.390.412	17.758.189	-	<b>48.547.476</b>
	Indeks	78,5	96,5	-	95,0	107,6	-	<b>94,5</b>
Projekti II prioriteta	Izmjene Plana 2015.	13.083.269	-	1.756.610	-	18.344.403	34.615.450	<b>67.799.732</b>
	Ostvarenje 2015.	10.576.013	-	1.499.360	-	16.513.228	32.304.454	<b>60.893.054</b>
	Indeks	80,8	-	85,4	-	90,0	93,3	<b>89,8</b>
Ukupno projekti I i II prioriteta	Izmjene Plana 2015.	27.729.389	6.112.000	1.756.610	14.100.000	34.847.993	34.615.450	<b>119.161.442</b>
	Ostvarenje 2015.	22.075.106	5.899.781	1.499.360	13.390.412	34.271.417	32.304.454	<b>109.440.530</b>
	Indeks	79,6	96,5	85,4	95,0	98,3	93,3	<b>91,8</b>

Od ukupnog iznosa sredstava koje su tijekom 2015. godine doznačile Hrvatske vode u iznosu od 34.271.417,00 kn iznos od 128.680,20 kn koji je doznačen po ugovorima o sufinanciranju za 2015. godinu odnosi se na radove koji su izvršeni i plaćeni u 2014. godini iz naknade za razvoj, te su se time oslobodila sredstva naknade za razvoj grada Rijeke u iznosu od 93.020,94 kn (po investiciji: rekonstrukcija mješovite kanalizacije u razdjelnu i izgradnja/rekonstrukcija vodoopskrbne mreže Brašćine-Pulac-jug; Ulice internacionalnih brigada i Drenovski put) i grada Kraljevice u iznosu od 35.659,26 kn (po investiciji: gradnja vodovodnog ogranka Banj) za daljnje investiranje.

Grafikon 1: UTROŠENA SREDSTVA PO IZVORIMA FINANCIRANJA

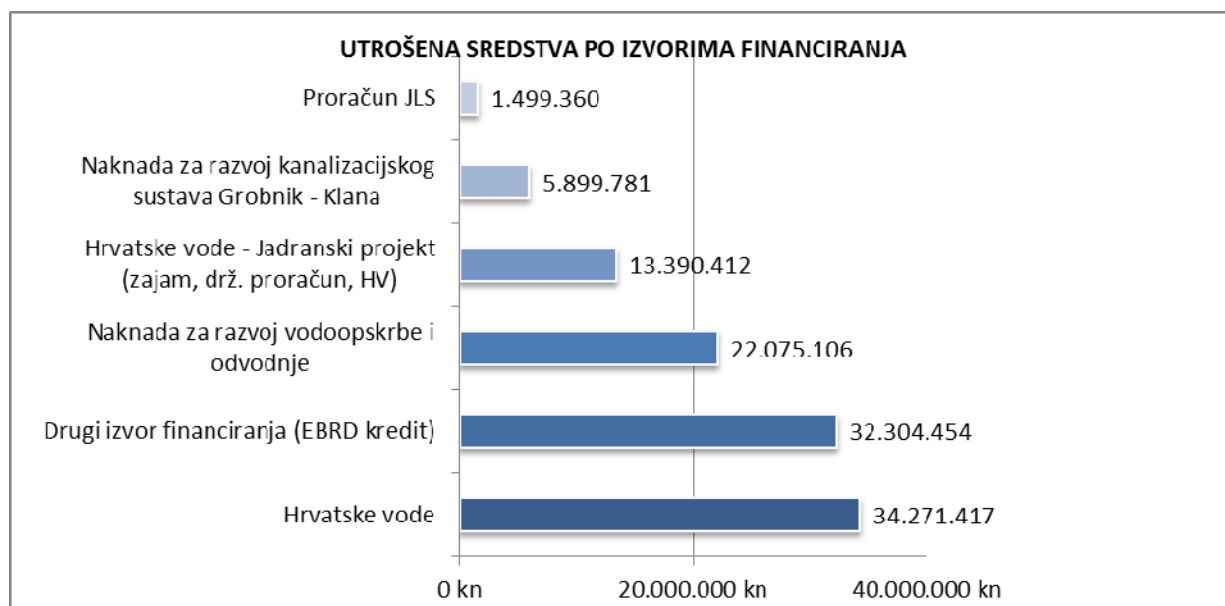

U nastavku se daje pregled utrošenih sredstava naknade za razvoj vodoopskrbe i odvodnje u projekte I i II prioriteta te naknade za razvoj kanalizacijskog sustava Grobnik – Klana po jedinicama lokalne samouprave.

Tablica 2: RASPORED UTROŠENIH SREDSTAVA NAKNADE ZA RAZVOJ VODOOPSKRBE I ODVODNJE U PROJEKTE I I II PRIORITETA TE NAKNADE ZA RAZVOJ KAN. SUSTAVA GROBNIK – KLANA PO JLS ZA 2015. GODINU

(u kn bez lpa)

Jedinica lokalne samouprave	Utrošena sredstva naknade za razvoj u projekte vodoopskrbe i odvodnje			Utrošena sredstva naknade za razvoj odvodnje Grobnik - Klana	Sveukupno utrošena sredstva naknade
	I prioritet	II prioritet	Ukupno		
1	2	3	4 (2+3)	5	6 (4+5)
<b>Grad Rijeka</b>	7.994.170	8.725.301	<b>16.719.470</b>	3.604.766	<b>20.324.237</b>
<b>Grad Bakar</b>	499.061	298.206	<b>797.267</b>	234.811	<b>1.032.078</b>
<b>Grad Kastav</b>	512.860	326.523	<b>839.382</b>	212.982	<b>1.052.364</b>
<b>Grad Kraljevica</b>	278.278	279.165	<b>557.443</b>	153.984	<b>711.428</b>
<b>Općina Čavle</b>	342.673	69.169	<b>411.842</b>	147.495	<b>559.336</b>
<b>Općina Jelenje</b>	240.331	21.308	<b>261.639</b>	113.866	<b>375.505</b>
<b>Općina Klana</b>	73.594	3.690	<b>77.284</b>	31.859	<b>109.143</b>
<b>Općina Kostrena</b>	784.238	613.676	<b>1.397.914</b>	1.092.049	<b>2.489.964</b>
<b>Općina Viškovo</b>	773.889	238.975	<b>1.012.864</b>	307.969	<b>1.320.833</b>
<b>UKUPNO:</b>	<b>11.499.094</b>	<b>10.576.013</b>	<b>22.075.106</b>	<b>5.899.781</b>	<b>27.974.887</b>

## 8.1. RAZVOJNI ZAHVATI VODOOPSKRBE I ODVODNJE OTPADNIH VODA OD ZAJEDNIČKOG INTERESA SUVLASNIKA DRUŠTVA I ISPORUČITELJA VODNE USLUGE (I PRIORITET)

Tablica 3: UTROŠENA SREDSTVA U PROJEKTE I. PRIORITETA U 2015. GODINI U USPOREDBI S IZMJENAMA PLANA ZA 2015. GODINU I VRIJEDNOST IZVRŠENIH RADOVA U 2015. GODINI

(u kn bez lipa)

Točka iz Izmjena Plana 2015.	Razvojni zahvat / Izvor financiranja	Izmjene Plana 2015.	Utrošena / Doznačena sredstva 2015.	Indeks	Izvedeni radovi 2015.
1	2	3	4	5	6
<b>8.1.Vodoopskrba</b>					
8.1.1.	<b>Kreditne obveze Marišćina</b> Kreditne obveze se otplaćuju sukladno otplatnom planu.	<b>3.348.000</b>	<b>3.336.063</b>	<b>99,6</b>	
	naknada za razvoj vodoopskrbe i odvodnje	3.348.000	3.336.063	99,6	
8.1.2.	<b>Vodoopskrba visinske zone Kostrena - nastavak</b> izrade projektne dokumentacije za izgradnju CS i TS Martinšćica sa zahvatima u sklopu vodocrpilišta Podmirene su obaveze iz prethodne godine, dobivene suglasnosti od strane Državnog ureda za upravljanje državnom imovinom (DUUDI) kao preduvjet za izdavanje građevinske dozvole. Postupak izdavanja građevinske dozvole je u toku.	<b>500.000</b>	<b>209.000</b>	<b>41,8</b>	<b>49.000</b>
	naknada za razvoj vodoopskrbe i odvodnje	500.000	209.000	41,8	
8.1.3.	<b>Dogradnja vodoopskrbnog podsustava na području Grobinštine i gradnja podsustava za transport vode na Platak</b> Izrada projektne dokumentacije odvija se planiranom dinamikom te su svi projekti predani na ishođenje lokacijske dozvole.	<b>2.600.000</b>	<b>2.585.219</b>	<b>99,4</b>	<b>1.798.419</b>
	naknada za razvoj vodoopskrbe i odvodnje	1.181.120	1.166.339	98,7	
	Hrvatske vode	1.418.880	1.418.880	100,0	
8.1.4.	<b>Gradnja dijela vodoopskrbnog sustava područja Streljana-Kastav-Klana na području gradnje ceste D 427 – III etapa gradnje</b> Započeli su radovi na polaganju transportnog i opskrbnog cjevovoda na III etapi izgradnje državne ceste D 427 (investitor Hrvatske ceste), a uvjetovano dinamikom izgradnje iste. Za opskrbni cjevovod izrađena je izvedbena dokumentacija i pribavljen materijal.	<b>330.000</b>	<b>324.096</b>	<b>98,2</b>	<b>178.871</b>
	naknada za razvoj vodoopskrbe i odvodnje	330.000	324.096	98,2	
<b>8.2.Odvodnja</b>					
8.2.1.	<b>Kanalizacija Grobnik - kreditne obveze</b> Kreditne obveze se otplaćuju sukladno otplatnom planu (I i II tranša).	<b>6.507.000</b>	<b>6.410.018</b>	<b>98,5</b>	
	naknada za razvoj odvodnje Grobnik - Klana	3.532.000	3.560.469	100,8	
	Hrvatske vode	2.975.000	2.849.549	95,8	

Točka iz Izmjena Plana 2015.	Razvojni zahvat / Izvor financiranja	Izmjene Plana 2015.	Utrošena / Doznačena sredstva 2015.	Indeks	Izvedeni radovi 2015.
1	2	3	4	5	6
8.2.2.	<p><b>Kanalizacijski sustav Rijeka-Grobnik - II faza</b> podprojekta Rijeka-Grobnik</p> <p>Završeni su radovi na svim podprojektima:  <b>Podprojektu W5:</b> Mjesna kanalizacijska mreža naselja Mavrinci i Svilno gdje su izvedeni radovi na izgradnji 5300 metara kanalizacijskog kolektora te prelaganje/zamjena vodoopskrbnih cjevovoda u dužini od 2300 m.  <b>Podprojektu W6:</b> Mjesna kanalizacijska mreža naselja Bajčevo selo, Buzdohanj, Mavrinci, Cernik, Svilno i Orehovica gdje su izvedeni radovi na izgradnji 2800 metara kanalizacijskog kolektora sa 2 crpne stanice te prelaganje/zamjena vodoopskrbnih cjevovoda u dužini od 1400 m.  <b>Podprojektu W7:</b> Mjesna kanalizacijska mreža naselja Svilno, Orehovica, Pašac i Cernik gdje su izvedeni radovi na izgradnji 7300 metara kanalizacijskog kolektora sa 1 crpnom stanicom te prelaganje/zamjena vodoopskrbnih cjevovoda u dužini od 3100 m.  <b>Podprojektu W8:</b> izgradnja CS Tutnovo sa pripadajućim cjevovodom u dužini od 156 m. Podprojekt W8 je naknadno dogovoren i izveden kako bi se iskoristila sredstva Zajma.</p>	16.680.000	15.729.724	94,3	9.476.780
	naknada za razvoj odvodnje Grobnik - Klana	2.580.000	2.339.312	90,7	
	Hrvatske vode Jadranski projekt (zajam, drž. proračun, HV)	14.100.000	13.390.412	95,0	
8.2.3.	<p>Gradnja sanitarnog kolektora u sklopu <b>gradnje 4. faze I. etape te II. i III. etape državne ceste D 427 Čvor Marčelji (nova A7) - Viškovo - Čvor Rujevica (A7)</b></p> <p>Tijekom 2015.g. izgrađen je sanitarni kolektor u dužini od cca 5700 m od ukupno ugovorenih 6630 m. Dinamika gradnje sanitarnog kolektora ovisi o gradnji državne ceste prema Županijskom centru za gospodarenje otpadom Marišćina.</p>	6.800.000	6.481.751	95,3	7.094.370
	naknada za razvoj vodoopskrbe i odvodnje	4.387.000	2.688.701	61,3	
	Hrvatske vode	2.413.000	3.793.050	157,2	
<b>8.3. Zajednički projekti vodoopskrbe i odvodnje</b>					
8.3.1.	<p><b>EU projekti</b>  <b>-aglomeracija Rijeka (Rijeka, Kastav, Viškovo, Čavle, Jelenje),</b>  <b>-aglomeracija Bakar-Kostrena,</b>  <b>-aglomeracija Kraljevica</b>  <b>AGLOMERACIJA RIJEKA</b>  U 2015.g.nastavljena je dorada <b>Studije izvedivosti</b>, kao i izrada <b>Studije utjecaja na okoliš</b> koje su u obvezi biti završene u prvoj polovici 2016. godine.</p> <p>Raskinut je postojeći Ugovor za izradu idejnog projekta sa ishođenjem lokacijske dozvole <b>uređaja za pročišćavanje otpadnih voda aglomeracije Rijeka – UPOV Rijeka</b>, s obzirom da je projektiranje rađeno po staroj verziji Studije izvedivosti. Definirana je lokacija UPOV-a, kao i tehničko/tehnološki aspekt istoga, te je ugovorena izrada novog idejnog projekta sa ishođenjem</p>	14.596.710	13.471.605	92,3	13.653.888

Točka iz Izmjena Plana 2015.	Razvojni zahvat / Izvor financiranja	Izmjene Plana 2015.	Utrošena / Doznačena sredstva 2015.	Indeks	Izvedeni radovi 2015.
1	2	3	4	5	6
	<p>lokacijske dozvole. Krajem godine je započela izrada ovog projekta. U sklopu izrade idejnog projekta UPOV-a Rijeka, ugovorena je i izrada dokumentacije za nadmetanje za projektiranje i izgradnju UPOV-a Rijeka (FIDIC Žuta knjiga) i dokumentacije za nadmetanje za Stručni nadzor i koordinatora II za UPOV-Rijeka.</p> <p>Po ugovoru za izradu idejnih i glavnih projekata <b>rekonstrukcije i dogradnje sustava odvodnje otpadnih voda na području aglomeracije Rijeka</b> – Sustav javne odvodnje „Grad“ izrađeni su gotovo svi idejni projekti te su za iste podneseni zahtjevi za izdavanje lokacijskih dozvola. Započelo se s izradom glavnih projekata. Zajednici ponuditelja produljio se rok izvršenja usluge. Paralelno se vrši imovinsko-pravna priprema.</p> <p>Po ugovoru za izradu idejnih i glavnih projekata <b>proširenja sustava distribucije, prikupljanja i odvodnje otpadnih voda za područje aglomeracije Rijeka – Sustav javne odvodnje „Grad“ – 2. dio proširenja sustava na području grada Rijeke i grada Kastva, te općina Viškovo, Jelenje, Čavle i Matulji</b> također su izrađeni gotovo svi idejni projekti te su za većinu izdane lokacijske dozvole. Započelo se s izradom glavnih projekata. Kroz rješavanje imovinsko pravne pripreme, koja je u tijeku, naišlo se na veći broj problema što je uzrokovalo izmjene pojedinih projekata, te usporilo proces projektiranja i pribavljanja dozvola. Posljedično se zajednici izvršitelja ponovno produžio rok izvršenja usluge.</p> <p><b>AGLOMERACIJA BAKAR-KOSTRENA</b> U tijeku je izrada Studije izvedivosti, Studije utjecaja na okoliš i aplikacija za EU fondove. Izvršena je analiza postojećeg stanja, tehničko rješenje i definiranje obuhvata projekta, osnovne pretpostavke financijske i ekonomske analize te izrađena radna verzija studije izvodljivosti.</p> <p><b>AGLOMERACIJA KRALJEVICA</b> Odabran je izrađivač Studije izvodljivosti i Studije utjecaja na okoliš prema projektnom zadatku (1.etape). Izrađen je uvodni izvještaj, analiza postojećeg stanja i analiza potrebe te definiranje aglomeracije. Izrađena je radna verzija Studije izvedivosti koja je 24.11.2015.g. prezentirana Jasperu.</p>				
	naknada za razvoj vodoopskrbe i odvodnje	4.900.000	3.774.895	77,0	
	Hrvatske vode	9.696.710	9.696.710	100,0	
	<b>Izvori financiranja</b>				
	naknada za razvoj vodoopskrbe i odvodnje	14.646.120	11.499.094	78,5	
	naknada za razvoj odvodnje Grobnik - Klana	6.112.000	5.899.781	96,5	
	Hrvatske vode Jadranski projekt	14.100.000	13.390.412	95,0	32.251.327
	Hrvatske vode	16.503.590	17.758.189	107,6	
	<b>SVEUKUPNO ZA RAZVOJNE ZAHVATE VODOOPSKRBE I ODVODNJE OTPADNIH VODA (I. PRIORITET)</b>	<b>51.361.710</b>	<b>48.547.476</b>	<b>94,5</b>	

## 8.2. ULAGANJA U PROJEKTE VODOOPSKRBE I ODVODNJE OD INTERESA ZA JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE FINANCIRANI IZ PRIPADAJUĆEG PREOSTALOG DIJELA NAKNADE ZA RAZVOJ I OSTALIH IZVORA (II PRIORITET)

U sljedećim tablicama daje se prikaz utrošenih sredstava u 2015.g. u projekte vodoopskrbe i odvodnje od interesa za svaku jedinicu lokalne samouprave (II prioritet) po izvorima financiranja i usporedba s Izmjenama i dopunama Plana za 2015.godinu te vrijednost izvršenih radova za 2015. godinu.

Tablica 4: UTROŠENA SREDSTVA U PROJEKTE II PRIORITETA ZA 2015. GODINU U USPOREDBI S IZMJENAMA PLANA ZA 2015. GODINU I VRIJEDNOST IZVRŠENIH RADOVA U 2015. GODINI ZA **GRAD RIJEKU**

Naziv investicije / Točka iz Izmjene Plana 2015.	Izvori financiranja (u kn bez lipa)										Izvršeni radovi 2015.
	Naknada za razvoj		Proračun		Hrvatske vode		Drugi izvor financiranja (kredit)		Ukupno		
	Izmjene Plana 2015.	Utrošena sredstva 2015.	Izmjene Plana 2015.	Doznačena sredstva 2015.	Izmjene Plana 2015.	Doznačena sredstva 2015.	Izmjene Plana 2015.	Utrošena sredstva 2015.	Izmjene Plana 2015.	Utrošena / Doznačena sredstva 2015.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10(2+4+6+ 8)	11(3+5+7+9)	12
<b>8.5.1. Projekti vodoopskrbe</b>											
1.Vodoopskrba stambenog područja Martinkovac – VS Dražice – priprema dokumentacije za gradnju	72.000	64.870							72.000	64.870	64.870
2. Staro groblje Drenova - projektiranje i gradnja vodovodnog ogranka	17.000	6.703							17.000	6.703	6.703
3. Radnička ulica - projektiranje vodovodnog ogranka	25.000	18.080							25.000	18.080	18.080
4. VS / VT Strmica - projektiranje	0	0							0	0	0
5. Vodovodni ogranak Bogomira Čikovića Marčeva -	214.980	213.332			550.020	550.021			765.000	763.353	714.853



projektiranje i gradnja vodovodnog ogranka											
6.Vodovodni ogranak Pod Ohruštvom - projektiranje vodovodnog ogranka	0	0						0	0	0	
<b>Ukupno za projekte vodoopskrbe</b>	<b>328.980</b>	<b>302.985</b>			<b>550.020</b>	<b>550.021</b>		<b>879.000</b>	<b>853.006</b>	<b>804.506</b>	
<b>8.6.1. Projekti odvodnje</b>											
1.Sanitarna kanalizacija Radićeve ulice – Šetalište Joakima Rakovca – priprema dokumentacije za gradnju i gradnja sanitarne kanalizacije	345.000	120.342						345.000	120.342	212.092	
2. CS Brajdica na Pečinama - priprema za gradnju	0	0						0	0	0	
<b>Ukupno za projekte odvodnje</b>	<b>345.000</b>	<b>120.342</b>						<b>345.000</b>	<b>120.342</b>	<b>212.092</b>	
<b>8.7.1. Zajednički projekti vodoopskrbe i odvodnje</b>											
1.Financiranje putem Europske banke za obnovu i razvoj (EBRD) - gradnja, dodatni troškovi vezani uz realizaciju projekta i troškovi kredita – popis projekata u točki 8.2.1.	400.000	385.431			870.500	870.150	33.335.100	30.958.214	34.605.600	32.213.795	34.152.216
2.Prateći radovi na vodovodu uz radove financirane putem Europske banke za obnovu i razvoj (EBRD)	0	0						0	0	0	
3. Financiranje Hrvatskih voda putem EIB - CEB programa – gradnja i dodatni	2.400.000	1.931.754			7.200.000	5.652.021			9.600.000	7.583.775	9.745.427

troškovi vezani uz realizaciju projekta - popis projekata u točki 8.2.2.											
4. Prateći radovi na vodovodu uz radove financirane od strane Hrvatskih voda putem EIB-CEB programa	0	0						0	0	0	
5. Priprema dokumentacije i ostali troškovi za dogradnju sustava vodnih građevina i refinanciranje HV	10.000	3.950			146.868	146.869			156.868	150.819	3.950
6. Zajednička izgradnja na području Grada Rijeke – gradnja ogranaka vodovoda i kanalizacije u sklopu izgradnje prometnica, uređenja trgova i ostalih javnih površina sukladno prioritetima Grada Rijeke - ulice Riva i I. Zajca - Stadion Kantrida - Kampus - praćenje HOPS-a - sanitarna kanalizacija kolno-pristupnog puta na Marinićima - Hostov breg - Adamićeva i Krešimirova ulica - kanalizacija i vodovod kolno-pristupnog puta Brašćine i Ul. Kozala - DTK instalacije za upravljanje sustavom	900.000	134.779							900.000	134.779	156.258

vodovoda i kanalizacije											
7.Martinkovac - gradnja vodovoda i sanitarne kanalizacije	330.000	204.888						330.000	204.888	275.058	
8.Koblerov trg - dovršetak gradnje vodovoda i sanitarne kanalizacije	260.000	257.374						260.000	257.374	142.763	
9.Obveze po kreditu za Prioritete izgradnje (zajedničke) kom. Infrastr. Grada Rijeke	5.400.000	5.383.798						5.400.000	5.383.798	660.534	
<b>Ukupno za zajedničke projekte vodoopskrbe i odvodnje</b>	<b>9.700.000</b>	<b>8.301.974</b>			<b>8.217.368</b>	<b>6.669.040</b>	<b>33.335.100</b>	<b>30.958.214</b>	<b>51.252.468</b>	<b>45.929.228</b>	<b>45.136.206</b>
<b>SVEUKUPNO PROJEKTI VODOOPSKRBE I ODVODNJE</b>	<b>10.373.980</b>	<b>8.725.301</b>			<b>8.767.388</b>	<b>7.219.061</b>	<b>33.335.100</b>	<b>30.958.214</b>	<b>52.476.468</b>	<b>46.902.575</b>	<b>46.152.804</b>

Tablica 5: UTROŠENA SREDSTVA U PROJEKTE II PRIORITETA U 2015. GODINI U USPOREDBI S IZMJENAMA PLANA ZA 2015. GODINU I VRIJEDNOST IZVRŠENIH RADOVA U 2015. GODINI ZA **GRAD BAKAR**

Naziv investicije / Točka iz Izmjene Plana 2015.	Izvori financiranja (u kn bez lipa)										Izvršeni radovi 2015.
	Naknada za razvoj		Proračun		Hrvatske vode		Drugi izvor financiranja (kredit)		Ukupno		
	Izmjene Plana 2015.	Utrošena sredstva 2015.	Izmjene Plana 2015.	Doznačena sredstva 2015.	Izmjene Plana 2015.	Doznačena sredstva 2015.	Izmjene Plana 2015.	Utrošena sredstva 2015.	Izmjene Plana 2015.	Utrošena / Doznačena sredstva 2015.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10(2+4+6+8)	11(3+5+7+9)	12
<b>8.5.2. Projekti vodoopskrbe</b>											
1. Vodoopskrba naselja Melnice u Gradu Bakru - II faza - priprema i početak gradnje	127.000	120.120							127.000	120.120	120.120
2. Veberova ulica od kbr. 16 - priprema dokumentacije za gradnju vodovodnog ogranka	11.000	10.588							11.000	10.588	10.588
3. Škrljevo 1- priprema dokumentacije za gradnju vodovodnog ogranka	23.500	0							23.500	0	0
4. Škrljevo naselje - priprema dokumentacije za gradnju vodovodnog ogranka	18.500	798							18.500	798	798
5. Lonja - Hreljin- priprema dokumentacije za gradnju vodovodnog ogranka	15.500	5.318							15.500	5.318	5.318
6. Kukuljanovo 160 - priprema dokumentacije za gradnju vodovodnog ogranka	13.500	618							13.500	618	618
7. Krasica - Višnjevica- priprema dokumentacije za gradnju i gradnja vodovodnog ogranka	76.035	73.713			213.965	215.871			290.000	289.584	289.584

8.Škrljevo - Dumbrava- priprema dokumentacije za gradnju vodovodnog ogranka	15.000	4.146						15.000	4.146	4.146
9.Krasica 78 A- priprema dokumentacije za gradnju i gradnja vodovodnog ogranka	31.587	31.105		64.413	64.413			96.000	95.518	95.518
10.Vodoopskrbni cjevovod u cesti - od raskrižja D501 do spojne ceste čvora Hreljin u smjeru Oštrovica - projektiranje	51.800	51.800						51.800	51.800	51.800
11.Prijelazni troškovi projektiranja (ogranci)	0	0						0	0	0
<b>UKUPNO ZA PROJEKTE VODOOPSKRBE</b>	<b>383.422</b>	<b>298.206</b>		<b>278.378</b>	<b>280.284</b>			<b>661.800</b>	<b>578.490</b>	<b>578.490</b>

Tablica 6: UTROŠENA SREDSTVA U PROJEKTE II PRIORITETA U 2015. GODINI U USPOREDBI S IZMJENAMA PLANA ZA 2015. GODINU I VRIJEDNOST IZVRŠENIH RADOVA U 2015. GODINI ZA **GRAD KASTAV**

Naziv investicije / Točka iz Izmjene Plana 2015.	Izvori financiranja (u kn bez lipa)										Izvršeni radovi 2015.	
	Naknada za razvoj		Proračun		Hrvatske vode		Drugi izvor financiranja (kredit)		Ukupno			
	Izmjene Plana 2015.	Utrošena sredstva 2015.	Izmjene Plana 2015.	Doznačena sredstva 2015.	Izmjene Plana 2015.	Doznačena sredstva 2015.	Izmjene Plana 2015.	Utrošena sredstva 2015.	Izmjene Plana 2015.	Utrošena / Doznačena sredstva 2015.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10(2+4+6+8)	11(3+5+7+9)	12	
<b>8.5.3. Projekti vodoopskrbe</b>												
1.Donji Turki (Gec) - gradnja vodovodnog ogranka	63.000	33.989			237.000	156.451				300.000	190.440	213.375
2.Kastav-Klanci - gradnja vodovodnog ogranka	14.000	3.521			16.000	31.428				30.000	34.949	42.210
3.Kostanj (Jurčiči - Škrliji) - gradnja vodovodnog ogranka	43.000	16.426			257.000	177.402				300.000	193.828	270.214
4.Donji Spinčiči od kbr.124-126 – gradnja vodovodnog ogranka	17.000	3.547			33.000	41.036				50.000	44.583	54.098
5.Krajevac - gradnja vodovodnog ogranka	26.000	14.172			149.000	141.724				175.000	155.896	179.635
6.Šporeri - gradnja vodovodnog ogranka	55.000	18.919			245.000	304.857				300.000	323.776	369.718

7.Brničiči 5-9/1 - gradnja vodovodnog ogranka	12.000	4.165		38.000	29.541			50.000	33.706	37.649
8.Donji Turki - gradnja vodovodnog ogranka	233.000	146.467		867.000	907.041			1.100.000	1.053.508	1.242.413
9.Brničiči put Martiči - gradnja vodovodnog ogranka	107.000	32.146		293.000	332.837			400.000	364.983	447.760
10.Brnini - početak gradnje vodovodnog ogranka	5.000	3.690						5.000	3.690	3.690
11.Prijelazni troškovi projektiranja (ogranci)	0	0						0	0	0
<b>Ukupno za projekte vodoopskrbe</b>	<b>575.000</b>	<b>277.042</b>		<b>2.135.000</b>	<b>2.122.318</b>			<b>2.710.000</b>	<b>2.399.360</b>	<b>2.860.762</b>
<b>8.7.3. Zajednički projekti vodoopskrbe i odvodnje</b>										
1.Sanitarna kanalizacija RZ Žegoti - Šporova jama - Jurčiči, I faza – gradnja, dodatni troškovi vezani uz realizaciju projekta i troškovi kredita	12.000	11.652		27.000	26.912	735.100	708.532	774.100	747.096	709.374
2.Kanalizacija naselja Jurčiči - Jurjeniči - gradnja, dodatni troškovi vezani uz realizaciju projekta	8.000	6.502				545.250	637.709	553.250	644.210	660.683

3.Put Vladimira Nazora u staroj jezgri grada Kastva - ogranak kanalizacije i vodovoda - priprema dokumentacije za gradnju	35.000	31.327						35.000	31.327	31.327	
<b>Ukupno za zajedničke projekte vodoopskrbe i odvodnje</b>	<b>55.000</b>	<b>49.480</b>			<b>27.000</b>	<b>26.912</b>	<b>1.280.350</b>	<b>1.346.240</b>	<b>1.362.350</b>	<b>1.422.633</b>	<b>1.401.384</b>
<b>SVEUKUPNO PROJEKTI VODOOPSRBE I ODVODNJE</b>	<b>630.000</b>	<b>326.523</b>			<b>2.162.000</b>	<b>2.149.230</b>	<b>1.280.350</b>	<b>1.346.240</b>	<b>4.072.350</b>	<b>3.821.992</b>	<b>4.262.146</b>



Tablica 7: UTROŠENA SREDSTVA U PROJEKTE II PRIORITETA U 2015. GODINI U USPOREDBI S IZMJENAMA PLANA ZA 2015. GODINU I VRIJEDNOST IZVRŠENIH RADOVA U 2015. GODINI ZA **GRAD KRALJEVICU**

Naziv investicije / Točka iz Izmjene Plana 2015.	Izvori financiranja (u kn bez lipa)										Izvršeni radovi 2015.
	Naknada za razvoj		Proračun		Hrvatske vode		Drugi izvor financiranja (kredit)		Ukupno		
	Izmjene Plana 2015.	Utrošena sredstva 2015.	Izmjene Plana 2015.	Doznačena sredstva 2015.	Izmjene Plana 2015.	Doznačena sredstva 2015.	Izmjene Plana 2015.	Utrošena sredstva 2015.	Izmjene Plana 2015.	Utrošena / Doznačena sredstva 2015.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10(2+4+6+8)	11(3+5+7+9)	12
<b>8.5.4. Projekti vodoopskrbe</b>											
1.Put za Banj – početak gradnje vodovodnog ogranka	4.200	4.110							4.200	4.110	4.110
2.Banj – dovršetak gradnje vodovodnog ogranka	4.000	3.530			45.700	45.699			49.700	49.229	950
3.Fara k.br. 1, 2 i 3 i groblje Kraljevica - priprema dokumentacije za gradnju i gradnja vod. ogranka	264.903	261.600			640.097	618.290			905.000	879.891	902.634
4.Spojni cjevovod – Banj – nastavak pripreme dokumentacije za gradnju vodovodnog ogranka	10.000	9.925							10.000	9.925	9.925
5. Pod Banj - pristupna cesta – priprema dokumentacije za gradnju	0	0							0	0	0
<b>Ukupno za projekte vodoopskrbe</b>	<b>283.103</b>	<b>279.165</b>			<b>685.797</b>	<b>663.990</b>			<b>968.900</b>	<b>943.155</b>	<b>917.619</b>
<b>8.7.4. Zajednički projekti vodoopskrbe i odvodnje</b>											
1.Vodovodna i kanalizacijska mreža Jakovčičeve ulice (dio u cesti) – projektiranje i gradnja	0	0							0	0	0
2.Vodovodna i kanalizacijska mreža Jakovčičeve ulice - II dio - projektiranje	76.500	0							76.500	0	0
<b>Ukupno za zajedničke projekte vodoopskrbe i odvodnje</b>	<b>76.500</b>	<b>0</b>							<b>76.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>SVEUKUPNO PROJEKTI VODOOPSKRBE I ODVODNJE</b>	<b>359.603</b>	<b>279.165</b>			<b>685.797</b>	<b>663.990</b>			<b>1.045.400</b>	<b>943.155</b>	<b>917.619</b>

Tablica 8: UTROŠENA SREDSTVA U PROJEKTE II PRIORITETA U 2015. GODINI U USPOREDBI S IZMJENAMA PLANA ZA 2015. GODINU I VRIJEDNOST IZVRŠENIH RADOVA U 2015. GODINI ZA **OPĆINU KOSTRENA**

Naziv investicije / Točka iz Izmjene Plana 2015.	Izvori financiranja (u kn bez lipa)										Izvršeni radovi 2015.
	Naknada za razvoj		Proračun		Hrvatske vode		Drugi izvor financiranja (kredit)		Ukupno		
	Izmjene Plana 2015.	Utrošena sredstva 2015.	Izmjene Plana 2015.	Doznačena sredstva 2015.	Izmjene Plana 2015.	Doznačena sredstva 2015.	Izmjene Plana 2015.	Utrošena sredstva 2015.	Izmjene Plana 2015.	Utrošena / Doznačena sredstva 2015.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10(2+4+6+8)	11(3+5+7+9)	12
<b>8.5.5. Projekti vodoopskrbe</b>											
1. Vodovodni ogranci naselja Glavani - Ledine - Šubati Raspelje - gradnja	8.200	8.008							8.200	8.008	8.768
2.Rekonstrukcija i građenje tlačnog vodov. cjevovoda CS Martinšćica-VS Glavani i tlačno opskrbnog vod. cjevovoda VS Glavani – VS Solin, dionica Mažeri- Glavani	8.000	7.835							8.000	7.835	7.835
3.Vodosprema s hidroforskom stanicom Solin 2 - gradnja	610.400	451.086			2.749.600	2.545.554			3.360.000	2.996.640	2.972.866
4.Rekonstrukcija i gradnja tlačnog vodovodnog cjevovoda CS Martinšćica- VS Glavani, dionica Martinšćica-Mažeri	64.000	87.284							64.000	87.284	87.284
5.Vodoopskrba visinske zone Kostrena: dionica Solin - Sopalj - projektiranje	0	0							0	0	0
<b>Ukupno za projekte vodoopskrbe</b>	<b>690.600</b>	<b>554.213</b>			<b>2.749.600</b>	<b>2.545.554</b>			<b>3.440.200</b>	<b>3.099.767</b>	<b>3.076.753</b>

<b>8.6.5. Projekti odvodnje</b>											
1. Mažeri kolektor F7 - prateći troškovi	1.000	0							1.000	0	0
<b>Ukupno za projekte odvodnje</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>							<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8.7.5. Zajednički projekti vodoopskrbe i odvodnje</b>											
1.Gradnja komunalne infrastrukture vodovoda i kanalizacije Plešići – završetak gradnje	45.000	44.301							45.000	44.301	950
2.Priprema projektne i ostale dokumentacije za gradnju vodovoda i kanalizacije u Općini Kostrena	16.000	15.162							16.000	15.162	15.162
<b>Ukupno za zajedničke projekte vodoopskrbe i odvodnje</b>	<b>61.000</b>	<b>59.463</b>							<b>61.000</b>	<b>59.463</b>	<b>16.112</b>
<b>SVEUKUPNO PROJEKTI VODOOPSRBE I ODVODNJE</b>	<b>752.600</b>	<b>613.676</b>			<b>2.749.600</b>	<b>2.545.554</b>			<b>3.502.200</b>	<b>3.159.230</b>	<b>3.092.865</b>

Tablica 9: UTROŠENA SREDSTVA U PROJEKTE II PRIORITETA U 2015. GODINI U USPOREDBI S IZMJENAMA PLANA ZA 2015. GODINU I VRIJEDNOST IZVRŠENIH RADOVA U 2015. GODINI ZA **OPĆINU ČAVLE**

Naziv investicije / Točka iz Izmjene Plana 2015.	Izvori financiranja (u kn bez lipa)										Izvršeni radovi 2015.	
	Naknada za razvoj		Proračun		Hrvatske vode		Drugi izvor financiranja (kredit)		Ukupno			
	Izmjene Plana 2015.	Utrošena sredstva 2015.	Izmjene Plana 2015.	Doznačena sredstva 2015.	Izmjene Plana 2015.	Doznačena sredstva 2015.	Izmjene Plana 2015.	Utrošena sredstva 2015.	Izmjene Plana 2015.	Utrošena / Doznačena sredstva 2015.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10(2+4+6+8)	11(3+5+7+9)	12	
<b>8.5.6. Projekti vodoopskrbe</b>												
1.Soboli 2 – priprema dokumentacije za gradnju i gradnja vodovodnog ogranka	69.314	69.169			152.686	152.686				222.000	221.855	221.855
<b>UKUPNO ZA PROJEKTE VODOOPSKRBE</b>	<b>69.314</b>	<b>69.169</b>			<b>152.686</b>	<b>152.686</b>				<b>222.000</b>	<b>221.855</b>	<b>221.855</b>

Tablica 10: UTROŠENA SREDSTVA U PROJEKTE II PRIORITETA U 2015. GODINI U USPOREDBI S IZMJENAMA PLANA ZA 2015. GODINU I VRIJEDNOST IZVRŠENIH RADOVA U 2015. GODINI ZA **OPĆINU VIŠKOVO**

Naziv investicije / Točka iz Izmjene Plana 2015.	Izvori financiranja (u kn bez lipa)										Izvršeni radovi 2015.
	Naknada za razvoj		Proračun		Hrvatske vode		Drugi izvor financiranja (kredit)		Ukupno		
	Izmjene Plana 2015.	Utrošena sredstva 2015.	Izmjene Plana 2015.	Doznačena sredstva 2015.	Izmjene Plana 2015.	Doznačena sredstva 2015.	Izmjene Plana 2015.	Utrošena sredstva 2015.	Izmjene Plana 2015.	Utrošena / Doznačena sredstva 2015.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10(2+4+6+8)	11(3+5+7+9)	12
<b>8.5.7. Projekti vodoopskrbe</b>											
1.Donji Jugi - gradnja vodovodnog ogranka	13.495	0	524.190	394.526	927.315	927.315			1.465.000	1.321.841	1.144.383
2.Gornj Jugi - gradnja vodovodnog ogranka	1.020	1.020	201.455	201.454	272.900	272.900			475.375	475.374	81.738
3.Brtuni N/N- gradnja vodovodnog ogranka	1.020	1.020	89.900	89.883	292.674	292.674			383.594	383.577	63.432
4.Vozišće 47 - 49 - gradnja vodovodnog ogranka	1.830	2.130	186.650	186.632	341.520	341.519			530.000	530.281	530.281
5.Kosi- gradnja vodovodnog ogranka	805	760	435.450	308.019	863.745	817.619			1.300.000	1.126.398	1.293.090
6. Mladenići k.br.30-39 - gradnja vodovodnog ogranka	70	1.020	115.000	114.928	340.155	340.154			455.225	456.102	456.102
7. Lučinići – gradnja vodovodnog ogranka	1.020	1.020	43.280	43.280	89.970	89.971			134.270	134.271	134.271
8.Garići – gradnja vodovodnog ogranka	1.020	1.020	52.085	52.084	151.255	151.253			204.360	204.357	204.357
9.Ferenci – gradnja vodovodnog ogranka	1.020	1.020	108.600	108.554	269.020	269.019			378.640	378.593	378.593
10. Pogled - Vrtače V2 – početak gradnje vodovodnog ogranka	9.500	3.772							9.500	3.772	3.772
11. Viškovo prema Adriametalu i Mladenići 19 – početak gradnje vodovodnog ogranka	9.300	0							9.300	0	5.030
12. Naselje Klići – početak gradnje vodovodnog ogranka	9.800	3.377							9.800	3.377	3.377

13. Lučići, Zorzići i novi dio Zorzići od k.br.64-70 – početak gradnje vodovodnog ogranka	6.800	3.630							6.800	3.630	3.630
14. Juraši NN – početak gradnje vodovodnog ogranka	9.500	0							9.500	0	4.550
15. Garići - petrolejska – početak gradnje vodovodnog ogranka	9.800	107							9.800	107	3.557
16. Perčevo- početak gradnje vodovodnog ogranka	24.300	12.267							24.300	12.267	15.927
17. Bujki 1-47 – početak gradnje vodovodnog ogranka	9.000	3.750							9.000	3.750	3.750
18. Vozišće k.br.48-61 – početak gradnje vodovodnog ogranka	6.500	0							6.500	0	3.230
19. Bujki k.br. 18 – 23 - priprema dokumentacije za gradnju vodovodnog ogranka	10.500	15.611							10.500	15.611	9.321
20. Biškupi - priprema dokumentacije za gradnju vodovodnog ogranka	28.000	22.854							28.000	22.854	22.703
21. Juraši - priprema dokumentacije za gradnju vodovodnog ogranka	12.000	12.413							12.000	12.413	12.413
22. Bezjaki - priprema dokumentacije za gradnju vodovodnog ogranka	22.000	15.423							22.000	15.423	11.894
23. Marinići - priprema dokumentacije za gradnju vodovodnog ogranka	18.500	15.910							18.500	15.910	15.585
24. Furićevo 62 ABCD - priprema dokumentacije za gradnju vodovodnog ogranka	6.500	0							6.500	0	0
25. Marinići 29d - priprema dokumentacije za gradnju vodovodnog ogranka	13.000	9.841							13.000	9.841	9.841
26. Blažići - priprema dokumentacije za gradnju vodovodnog ogranka	21.500	16.722							21.500	16.722	17.472
27. Marinići 140-142 a - priprema dokumentacije za gradnju vodovodnog ogranka	7.000	2.206							7.000	2.206	2.206

28.Bezjaki 19-24 - priprema dokumentacije za gradnju vodovodnog ogranka	13.500	1.854						13.500	1.854	1.504
29.Vrtače - Kosi - priprema dokumentacije za gradnju vodovodnog ogranka	74.000	37.589						74.000	37.589	73.589
30.Donji Sroki - priprema dokumentacije za gradnju vodovodnog ogranka	7.000	2.073						7.000	2.073	2.073
31.Dovičići - priprema dokumentacije za gradnju vodovodnog ogranka	7.000	1.515						7.000	1.515	1.515
32.Dovičići II - priprema dokumentacije za gradnju vodovodnog ogranka	7.000	2.000						7.000	2.000	2.000
33.Stupari kod 40 - priprema dokumentacije za gradnju vodovodnog ogranka	22.000	21.128						22.000	21.128	21.128
34.Stupari kod 33 - priprema dokumentacije za gradnju vodovodnog ogranka	6.000	2.472						6.000	2.472	2.472
35.Stupari - Straža - priprema dokumentacije za gradnju vodovodnog ogranka	27.000	11.611						27.000	11.611	11.611
36.Trtni - Juraši - priprema dokumentacije za gradnju i početak gradnje vodovodnog ogranka	12.800	6.090						12.800	6.090	6.090
37.Marčelji 100 - priprema dokumentacije za gradnju vodovodnog ogranka	46.000	5.752						46.000	5.752	5.872
38.Ronjgi - priprema dokumentacije za gradnju i početak gradnje vodovodnog ogranka	3.200	0						3.200	0	0
39.Prijelazni troškovi projektiranja	0	0						0	0	0
<b>UKUPNO ZA PROJEKTE VODOOPSKRBE</b>	<b>480.300</b>	<b>238.975</b>	<b>1.756.610</b>	<b>1.499.360</b>	<b>3.548.554</b>	<b>3.502.424</b>		<b>5.785.464</b>	<b>5.240.759</b>	<b>4.562.356</b>

Tablica 11: UTROŠENA SREDSTVA U PROJEKTE II PRIORITETA U 2015. GODINI U USPOREDBI S IZMJENAMA PLANA ZA 2015. GODINU I VRIJEDNOST IZVRŠENIH RADOVA U 2015. GODINI ZA **OPĆINU JELENJE**

Naziv investicije / Točka iz Plana poslovanja 2015.	Izvori financiranja (u kn bez lipa)										Izvršeni radovi 2015.
	Naknada za razvoj		Proračun		Hrvatske vode		Drugi izvor financiranja (kredit)		Ukupno		
	Izmjene Plana 2015.	Utrošena sredstva 2015.	Izmjene Plana 2015.	Doznačena sredstva 2015.	Izmjene Plana 2015.	Doznačena sredstva 2015.	Izmjene Plana 2015.	Utrošena sredstva 2015.	Izmjene Plana 2015.	Utrošena / Doznačena sredstva 2015.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10(2+4+6+8)	11(3+5+7+9)	12
<b>8.5.8. Projekti vodoopskrbe</b>											
1.Podhum 14a -f - početak gradnje vodovodnog ogranka	7.050	6.147							7.050	6.147	8.417
2.Linčetovo - pripreme dokumentacije za gradnju i gradnja vodovodnog ogranka	0	0							0	0	0
3.Podkilavačka i Težačka II faza - priprema dokumentacije za gradnju vodovodnog ogranka	9.000	9.800							9.000	9.800	9.800
4.Planinska 51 - 52 - priprema dokumentacije za gradnju vodovodnog ogranka	14.000	5.361							14.000	5.361	5.361
<b>UKUPNO ZA PROJEKTE VODOOPSKRBE</b>	<b>30.050</b>	<b>21.308</b>							<b>30.050</b>	<b>21.308</b>	<b>23.578</b>



Tablica 12: UTROŠENA SREDSTVA U PROJEKTE II PRIORITETA U 2015. GODINI U USPOREDBI S IZMJENAMA PLANA ZA 2015. GODINU I VRIJEDNOST IZVRŠENIH RADOVA U 2015. GODINI ZA **OPĆINU KLANA**

Naziv investicije / Točka iz Plana poslovanja 2015.	Izvori financiranja (u kn bez lipa)										Izvršeni radovi 2015.	
	Naknada za razvoj		Proračun		Hrvatske vode		Drugi izvor financiranja (kredit)		Ukupno			
	Izmjene Plana 2015.	Utrošena sredstva 2015.	Izmjene Plana 2015.	Doznačena sredstva 2015.	Izmjene Plana 2015.	Doznačena sredstva 2015.	Izmjene Plana 2015.	Utrošena sredstva 2015.	Izmjene Plana 2015.	Utrošena / Doznačena sredstva 2015.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10(2+4+6+8)	11(3+5+7+9)	12	
<b>8.5.9. Projekti vodoopskrbe</b>												
1.Poslovna zona Škalnica – početak gradnje vodovodnog ogranka	4.000	3.690								4.000	3.690	3.690
<b>UKUPNO ZA PROJEKTE VODOOPSRBE</b>	<b>4.000</b>	<b>3.690</b>								<b>4.000</b>	<b>3.690</b>	<b>3.690</b>

Tablica 13: REKAPITULACIJA UTROŠENIH SREDSTAVA PO IZVORIMA FINANCIRANJA U PROJEKTE VODOOPSKRBE I ODVODNJE II PRIORITETA u U 2015. GODINI U USPOREDBI S IZMJENAMA PLANA ZA 2015. GODINU I IZVRŠENI RADOVI U 2015. GODINE ZA SVAKU JLS

(u kn bez lipa)

Grad / Općina	Naziv investicije	Izvori financiranja										Izvršeni radovi 2015.
		Naknada za razvoj		Proračun		Hrvatske vode		Drugi izvor financiranja (kredit)		Ukupno		
		Izmjene Plana 2015.	Utrošena sred. 2015.	Izmjene Plana 2015.	Doznačena sred. 2015.	Izmjene Plana 2015.	Doznačena sred. 2015.	Izmjene Plana 2015.	Utrošena sred. 2015.	Izmjene Plana 2015.	Utrošena / Doznačena sred. 2015.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10(2+4+6+8)	11(3+5+7+9)	12	
<b>Rijeka</b>	Ukupno projekti vodoopskrbe i odvodnje	10.373.980	8.725.301	-	-	8.767.388	7.219.061	33.335.100	30.958.214	52.476.468	46.902.575	46.152.804
<b>Bakar</b>	Ukupno projekti vodoopskrbe	383.422	298.206	-	-	278.378	280.284	-	-	661.800	578.490	578.490
<b>Kastav</b>	Ukupno projekti vodoopskrbe i odvodnje	630.000	326.523	-	-	2.162.000	2.149.230	1.280.350	1.346.240	4.072.350	3.821.992	4.262.146
<b>Kraljevica</b>	Ukupno projekti vodoopskrbe i odvodnje	359.603	279.165	-	-	685.797	663.990	-	-	1.045.400	943.155	917.619
<b>Kostrena</b>	Ukupno projekti vodoopskrbe i odvodnje	752.600	613.676	-	-	2.749.600	2.545.554	-	-	3.502.200	3.159.230	3.092.865
<b>Čavle</b>	Ukupno projekti vodoopskrbe	69.314	69.169	-	-	152.686	152.686	-	-	222.000	221.855	221.855
<b>Viškovo</b>	Ukupno projekti vodoopskrbe	480.300	238.975	1.756.610	1.499.360	3.548.554	3.502.424	-	-	5.785.464	5.240.759	4.562.356
<b>Jelenje</b>	Ukupno projekti vodoopskrbe	30.050	21.308	-	-	-	-	-	-	30.050	21.308	23.578
<b>Klana</b>	Ukupno projekti vodoopskrbe	4.000	3.690	-	-	-	-	-	-	4.000	3.690	3.690
<b>SVEUKUPNO PROJEKTI VODOOPSKRBE I ODVODNJE</b>		<b>13.083.269</b>	<b>10.576.013</b>	<b>1.756.610</b>	<b>1.499.360</b>	<b>18.344.403</b>	<b>16.513.228</b>	<b>34.615.450</b>	<b>32.304.454</b>	<b>67.799.732</b>	<b>60.893.054</b>	<b>59.815.403</b>

## 8.2.1. FINANCIRANJE RAZVOJNIH ZAHVATA VODOOPSKRBE I ODVODNJE OTPADNIH VODA PUTEM EUROPSKE BANKE ZA OBNOVU I RAZVOJ (EBRD)

Tablica 14: Utrošena sredstva iz EBRD kredita u 2015. godini u usporedbi s Izmjenama plana za 2015. godinu

Red.br.	Naziv projekta	Izmjene plana ulaganja za 2015. (kredit)	Utrošena sredstva iz EBRD kredita u 2015.g.	Indeks (%)
<b>LOT 1</b>				
1.	IZGRADNJA SANITARNE KANALIZACIJE I IZGRADNJA/REKONSTRUKCIJA VODOVODA PODRUČJE <b>SRDOČI - SJEVER</b>	2.808.700	2.987.447	106,4
2.	IZGRADNJA SANITARNE KANALIZACIJE I IZGRADNJA/REKONSTRUKCIJA VODOVODA PODRUČJE <b>GORNJI ZAMET, ZONA Z1</b>	1.562.650	1.599.410	102,4
<b>LOT 2</b>				
3.	IZGRADNJA SANITARNE KANALIZACIJE I IZGRADNJA/REKONSTRUKCIJA VODOVODA PODRUČJE <b>PEHLIN - MARINIĆI, ZONA P1</b>	1.169.000	1.181.492	101,1
4.	IZGRADNJA SANITARNE KANALIZACIJE I IZGRADNJA/REKONSTRUKCIJA VODOVODA PODRUČJE <b>PEHLIN MARINIĆI, ZONA P2</b>	1.135.350	777.621	68,5
5.	IZGRADNJA SANITARNE KANALIZACIJE I IZGRADNJA/REKONSTRUKCIJA VODOVODA PODRUČJE <b>PEHLIN - MARINIĆI, ZONA P3</b>	640.400	657.811	102,7
<b>LOT 3</b>				
6.	IZGRADNJA SANITARNE KANALIZACIJE I IZGRADNJA/REKONSTRUKCIJA VODOVODA PODRUČJA <b>TIBLJAŠI ŠKURINJE I FAZA</b>	3.607.600	4.034.740	111,8
7.	GRADNJA-REKONSTRUKCIJA SANITARNE KANALIZACIJE I PRATEĆIH VODOVODA PODRUČJA <b>DONJA DRENOVA - JUŽNI DIO</b>	9.717.800	8.841.904	91,0
<b>LOT 4</b>				
8.	GRADNJA-REKONSTRUKCIJA SANITARNE KANALIZACIJE I PRATEĆIH VODOVODA PODRUČJA <b>BRAŠĆINE - LUKOVIĆI</b>	7.908.350	6.753.470	85,4
9.	IZGRADNJA SANITARNE KANALIZACIJE I IZGRADNJA/REKONSTRUKCIJA VODOVODA PODRUČJE <b>PULAC</b>	4.785.250	4.124.319	86,2
<b>UKUPNO GRAD RIJEKA:</b> VODOVOD - 12.675,00 m KANALIZACIJA - 24.359,00 m + 1 kanalizacijska crpna stanica, te 678,00 m oborinskog kolektora i 1 upoj radi rekonstrukcije postojećeg mješovitog sustava u razdjelni		<b>33.335.100</b>	<b>30.958.214</b>	<b>92,9</b>

## 8.2.2. FINANCIRANJE HRVATSKIH VODA PUTEM EIB - CEB PROGRAMA

Tablica 15: Doznačena sredstva iz sredstava HV (EIB/CEB) u 2015. godini u usporedbi s Izmjenama plana za 2015. godinu

(u kn bez lipa)

Red. br.	Naziv investicije	PLANIRANA VRIJEDNOST HV (EIB/CEB) ZA 2015.G. (90%) PO IZMJENAMA PLANA		
		HV	Doznačena sredstva HV u 2015.g.	Indeks (%)
1.	<b>Donja Drenova / sjeverni dio</b> -gradnja/rekonstrukcija sanitarne kanalizacije u dužini od 2.559,00 m i vodovoda u dužini od 1.447,00 m	1.089.590	18.000	1,7
2.	<b>Gornji Zamet / ZONA Z-2</b> -gradnja/rekonstrukcija sanitarne kanalizacije u dužini od 2.041,00 m i vodovoda u dužini od 589,00 m	3.192.970	2.647.396	82,9
3.	<b>Gornji Zamet / ZONA Z-3</b> -gradnja/rekonstrukcija sanitarne kanalizacije u dužini od 980,00 m i tlačni vod u dužini od 138,00 m sa 1 CS te vodovoda u dužini od 949,00 m	1.735.670	1.714.459	98,8
4.	<b>Murini, MO Srdoči</b> -gradnja sanitarne kanalizacije u dužini od 373,00 m i vodovoda u dužini od 255,00 m	536.290	626.687	116,9
5.	Rekonstrukcija <b>CS Kostabela</b> sa pripadajućim cjevovodima u dužini kanalizacije od 353,00 m	645.480	645.479	100,0
<b>Ukupno:</b>		<b>7.200.000</b>	<b>5.652.021</b>	<b>78,5</b>

## SAŽETAK

### 8. GRADNJA KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA I KORIŠTENJE SREDSTAVA NAKNADE ZA RAZVOJ TE OSTALIH IZVORA FINANCIRANJA

#### I PRIORITET

Razvojni zahvati	Planirana sredstva (iz svih izvora) po Izmjenama Plana 2015.	Utrošena sredstva (iz svih izvora) ostvarenje 2015.	% realizacija Izmjene Plana 2015.	Izvršeni radovi 2015.
vodoopskrba	6.778.000	6.454.378	95,2	2.026.290
odvodnja	29.987.000	28.621.493	95,4	16.571.150
zajednički projekti vodoopskrbe i odvodnje	14.596.710	13.471.605	92,3	13.653.888
<b>Ukupno</b>	<b>51.361.710</b>	<b>48.547.476</b>	<b>94,5</b>	<b>32.251.327</b>

#### II PRIORITET

Grad/Općina	Planirana sredstva (iz svih izvora) po Izmjenama Plana 2015.	Utrošena sredstva (iz svih izvora) ostvarenje 2015.	% realizacija Izmjene Plana 2015.	Izvršeni radovi 2015.
Rijeka	52.476.468	46.902.575	89,4	46.152.804
Bakar	661.800	578.490	87,4	578.490
Kastav	4.072.350	3.821.992	93,9	4.262.146
Kraljevica	1.045.400	943.155	90,2	917.619
Kostrena	3.502.200	3.159.230	90,2	3.092.865
Čavle	222.000	221.855	99,9	221.855
Viškovo	5.785.464	5.240.759	90,6	4.562.356
Jelenje	30.050	21.308	70,9	23.578
Klana	4.000	3.690	92,3	3.690
<b>Ukupno</b>	<b>67.799.732</b>	<b>60.893.054</b>	<b>89,8</b>	<b>59.815.403</b>
<b>Sveukupno (I + II PRIORITET)</b>	<b>119.161.442</b>	<b>109.440.530</b>	<b>91,8</b>	<b>92.066.731</b>
