



Komunalno društvo  
**VODOVOD I KANALIZACIJA** d.o.o.  
za vodoopskrbu i odvodnju Rijeka

Dolac 14, 51000 Rijeka  
MB 3331903 OIB 80805858278

T: (051) 353 222 F: (051) 353 207  
E: [kdvik-rijeka@kdvik-rijeka.hr](mailto:kdvik-rijeka@kdvik-rijeka.hr)  
[www.kdvik-rijeka.hr](http://www.kdvik-rijeka.hr)

**GRADNJA KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA I  
KORIŠTENJE SREDSTAVA NAKNADE ZA RAZVOJ TE  
OSTALIH IZVORA FINANCIRANJA**

***IZVJEŠTAJ ZA 2017. GODINU***

Rijeka, travanj 2018.

## SADRŽAJ

<b>8. GRADNJA KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA I KORIŠTENJE SREDSTAVA NAKNADE ZA RAZVOJ TE OSTALIH IZVORA FINANCIRANJA.....</b>	<b>3</b>
8.1. RAZVOJNI ZAHVATI VODOOPSKRBE I ODVODNJE OTPADNIH VODA OD ZAJEDNIČKOG INTERESA SUVLASNIKA DRUŠTVA I ISPORUČITELJA VODNE USLUGE (I. PRIORITET).....	5
8.2. ULAGANJA U PROJEKTE VODOOPSKRBE I ODVODNJE OD INTERESA ZA JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE FINANCIRANI IZ PRIPADAJUĆEG PREOSTALOG DIJELA NAKNADE ZA RAZVOJ I OSTALIH IZVORA (II. PRIORITET) .....	10
SAŽETAK .....	27

## 8. GRADNJA KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA I KORIŠTENJE SREDSTAVA NAKNADE ZA RAZVOJ TE OSTALIH IZVORA FINANCIRANJA

Gradnja komunalnih vodnih građevina obuhvaća: projekte vodoopskrbe i odvodnje od zajedničkog interesa suvlasnika Društva i od značaja za funkcioniranje i unapređenje sustava vodoopskrbe i odvodnje financirane iz naknade za razvoj i ostalih izvora (I. PRIORITET) te projekte vodoopskrbe i odvodnje od interesa za jedinice lokalne samouprave financirane iz pripadajućeg preostalog dijela naknade za razvoj i ostalih izvora (II. PRIORITET).

U sljedećoj tablici daje se rekapitulacija ulaganja za 2017.g. u gradnju komunalnih vodnih građevina po izvorima financiranja za projekte I. i II. prioriteta.

Tablica 1: REKAPITULACIJA OSTVARENIH ULAGANJA U PROJEKTE I. i II. PRIORITETA PO IZVORIMA FINANCIRANJA ZA 2017. GODINU U USPOREDBI S IZMJENAMA PLANA ZA 2017. GODINU

(u kn bez lipa)

Opis		Izvori financiranja					Ukupno plan financiranja 2017.	
		Naknada za razvoj vodoop. i odvodnje	Naknada za razvoj kan. sus. Grobnik - Klana	EU sredstva	PGŽ	Hrvatske vode		Drugi izvor financiranja (kredit)
1		2	3	4	5	6	7	8 (2+3+4+5+6+7)
Projekti I. prioriteta	Izmjene Plana 2017.	3.460.800	4.690.000	-	300.000	12.891.000	5.240.000	26.581.800
	Ostvarenje 2017.	3.110.686	4.684.013	-	300.000	12.688.329	5.538.011	26.321.040
	Indeks	89,9	99,9	-	100,0	98,4	105,7	99,0
Projekti II. prioriteta	Izmjene Plana 2017.	19.131.580	-	5.611.000	-	20.698.130	-	45.440.710
	Ostvarenje 2017.	17.616.136	-	5.609.854	-	21.247.949	-	44.473.939
	Indeks	92,1	-	100,0	-	102,7	-	97,9
Ukupno projekti I. i II. prioriteta	Izmjene Plana 2017.	<b>22.592.380</b>	<b>4.690.000</b>	<b>5.611.000</b>	<b>300.000</b>	<b>33.589.130</b>	<b>5.240.000</b>	<b>72.022.510</b>
	Ostvarenje 2017.	<b>20.726.822</b>	<b>4.684.013</b>	<b>5.609.854</b>	<b>300.000</b>	<b>33.936.279</b>	<b>5.538.011</b>	<b>70.794.979</b>
	Indeks	<b>91,7</b>	<b>99,9</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>101,0</b>	<b>105,7</b>	<b>98,3</b>

U 2017. godini su iz strukturnih i Kohezijskog fonda EU doznačena bespovratna sredstva u ukupnom iznosu od 5.609.854 kn za projekte koji su se izvodili u sklopu Operativnog programa "Zaštita okoliša 2007. – 2013." i programa EN 2.1.17 - Financiranje provedbe investicijskih projekata koji se odnose na manje dijelove sustava javne vodoopskrbe/odvodnje - "Male intervencije 2".

Projekti su se tijekom 2015. i 2016. godine izvodili na području grada Rijeke i Kastva, a obuhvaćali su:

- „Izgradnju – rekonstrukciju sanitarne kanalizacije i pratećih vodovoda gradskog područja Gornji Zamet Z-2 i Z-3, Donja Drenova / sjeverni dio, Murini i rekonstrukcija CS Kostabela s pripadajućim cjevovodima“ (EN.2.1.17.-0040) i

- „Proširenje vodovodne infrastrukture u gradu Kastvu“ (EN.2.1.17.-0042).


Oba su projekta sufinancirana od strane Hrvatskih voda za vrijeme njihova izvođenja u 90% iznosu temeljem sklopljenih Ugovora o sufinanciranju s Hrvatskim vodama – EIB/CEB program, dok je preostalih 10% sredstava osiguralo Društvo iz naknade za razvoj vodoopskrbe i odvodnje.

EU fondovi su u 2017. godini dodijelili bespovratna sredstva za projekt u gradu Rijeci u iznosu od 2.113.898 kn od čega doznačena sredstva Hrvatskim vodama iznose 1.367.289 kn, a Društvo je ostvarilo povrat sredstava u iznosu od 746.609 kn.

Za projekt proširenja vodovodne infrastrukture u gradu Kastvu su EU fondovi dodijelili bespovratna sredstva u iznosu od 3.492.437 kn od čega su Hrvatskim vodama doznačena sredstva u iznosu od 3.263.561 kn, a Društvu povrat sredstava u iznosu od 228.876 kn.

Time sveukupno dobivena bespovratna sredstva iz EU fondova tijekom 2016. i 2017. godine za oba projekta iznose 18.161.993 kn.

Grafikon 1: UTROŠENA SREDSTVA PO IZVORIMA FINANCIRANJA U PROJEKTE I. I II. PRIORITETA

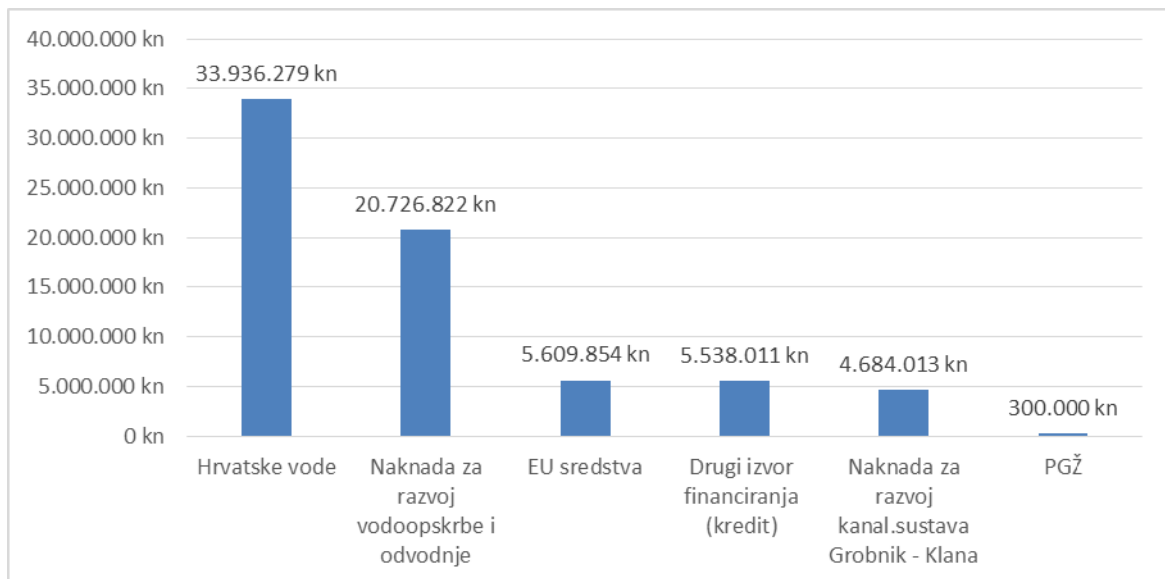

U nastavku se daje pregled utrošenih sredstava naknade za razvoj vodoopskrbe i odvodnje u projekte I. i II. prioriteta te naknade za razvoj kanalizacijskog sustava Grobnik – Klana po jedinicama lokalne samouprave.

Tablica 2: RASPORED UTROŠENIH SREDSTAVA NAKNADE ZA RAZVOJ VODOOPSKRBE I ODVODNJE U PROJEKTE I. I II. PRIORITETA TE NAKNADE ZA RAZVOJ KANALIZACIJSKOG SUSTAVA GROBNIK – KLANA PO JLS ZA 2017. GODINU

(u kn bez lipa)

Jedinica lokalne samouprave	Utrošena sredstva naknade za razvoj u projekte vodoopskrbe i odvodnje			Utrošena sredstva naknade za razvoj Grobnik - Klana	Sveukupno utrošena sredstva naknade
	I. Prioritet	II. Prioritet	Ukupno		
1	2	3	4 (2+3)	5	6 (4+5)
Grad Rijeka	2.168.459,41	11.293.195,93	13.461.655,34	3.247.426,39	16.709.081,73
Grad Bakar	140.603,02	579.654,67	720.257,69	217.338,21	937.595,90
Grad Kastav	145.580,12	442.542,77	588.122,89	215.933,01	804.055,90
Grad Kraljevica	77.767,16	1.088.786,98	1.166.554,14	118.037,13	1.284.591,27
Općina Čavle	93.942,73	7.620,00	101.562,73	139.115,20	240.677,93
Općina Jelenje	62.835,86	209.000,70	271.836,56	93.211,86	365.048,42
Općina Klana	21.152,66	34.950,00	56.102,66	31.382,89	87.485,55
Općina Kostrena	186.641,17	988.244,78	1.174.885,95	303.992,46	1.478.878,41
Općina Viškovo	213.704,15	2.972.140,18	3.185.844,33	317.576,10	3.503.420,43
<b>UKUPNO</b>	<b>3.110.686,28</b>	<b>17.616.136,01</b>	<b>20.726.822,29</b>	<b>4.684.013,25</b>	<b>25.410.835,54</b>

### 8.1. RAZVOJNI ZAHVATI VODOOPSKRBE I ODVODNJE OTPADNIH VODA OD ZAJEDNIČKOG INTERESA SUVLASNIKA DRUŠTVA I ISPORUČITELJA VODNE USLUGE (I. PRIORITET)

Tablica 3: UTROŠENA SREDSTVA U PROJEKTE I. PRIORITETA U 2017. GODINI U USPOREDBI S IZMJENAMA PLANA ZA 2017. GODINU I VRIJEDNOST IZVRŠENIH RADOVA U 2017. GODINI

(u kn bez lipa)

Točka iz Izmjena plana	Razvojni zahvat	Izmjene plana 2017.	Utrošena / Doznačena sredstva 2017.	Indeks	Izvedeni radovi 2017.
1	2	3	4	5(4/3)	6
<b>8.1.Vodoopskrba</b>					
8.1.1.	<b>Kreditne obveze Marišćina</b>				
	Kreditne obveze su u potpunosti otplaćene te je podmirena još preostala kamata po kreditu. naknada za razvoj vodoopskrbe i odvodnje	<b>5.800</b> 5.800	<b>5.800</b> 5.800	<b>100,0</b> 100,0	-
8.1.2.	<b>Vodoopskrba visinske zone Kostrena - nastavak izrade projektne dokumentacije za izgradnju CS i TS Martinšćica sa zahvatima u sklopu vodocrpilišta i priprema za početak gradnje</b>	<b>150.000</b>	<b>148.775</b>	<b>99,2</b>	<b>255.050</b>
	Završena je izrada ugovorene projektne dokumentacije (dio plaćanja će se izvršiti u 2018.). naknada za razvoj vodoopskrbe i odvodnje	150.000	148.775	99,2	

Točka iz Izmjena plana	Razvojni zahvat	Izmjene plana 2017.	Utrošena / Doznačena sredstva 2017.	Indeks	Izvedeni radovi 2017.
1	2	3	4	5(4/3)	6
8.1.3.	<b>Dogradnja vodoopskrbnog podsustava na području Grobinštine i gradnja podsustava za transport vode na Platak</b> - izrada projektne dokumentacije	<b>2.381.000</b>	<b>2.213.760</b>	<b>93,0</b>	<b>2.134.888</b>
	Nastavljena je izrada projektne dokumentacije sukladno s terminskim planom i projektним zadatkom. Paralelno se je provodila i imovinsko-pravna priprema.				
	naknada za razvoj vodoopskrbe i odvodnje	1.110.000	942.867	84,9	
	Hrvatske vode	971.000	970.893	100,0	
	PGŽ	300.000	300.000	100,0	
8.1.4.	<b>Gradnja dijela vodoopskrbnog sustava područja Streljana-Kastav-Klana na području gradnje ceste D 427</b> - III etapa gradnje	<b>345.000</b>	<b>341.504</b>	<b>99,0</b>	<b>322.811</b>
	Hrvatske ceste kao investitor nisu tijekom 2017. godine dovršile radove na izgradnji državne ceste prema Županijskom centru za gospodarenje otpadom Marišćina, pa nije dovršena niti izgradnja vodovoda koja ovisi o dinamici izradne ceste.				
	naknada za razvoj vodoopskrbe i odvodnje	345.000	341.504	99,0	
<b>8.2.Odvodnja</b>					
8.2.1.	<b>Kanalizacija Grobnik</b> - kreditne obveze Kreditne obveze se otplaćuju sukladno otplatnom planu (I. i II. tranša).	<b>6.715.000</b>	<b>6.708.866</b>	<b>99,9</b>	
	naknada za razvoj odvodnje Grobnik - Klana	3.670.000	3.668.368	100,0	
	Hrvatske vode	3.045.000	3.040.498	99,9	
8.2.2.	<b>Gradnja sanitarnog kolektora u sklopu gradnje 4. faze I.etape te II. i III. etape državne ceste D 427 Čvor Marčelji (nova A7) - Viškovo - Čvor Rujevica (A7)</b>	<b>50.000</b>	<b>48.033</b>	<b>96,1</b>	<b>48.033</b>
	Hrvatske ceste kao investitor nisu tijekom 2017. godine dovršile radove na izgradnji državne ceste prema Županijskom centru za gospodarenje otpadom Marišćina, pa nije dovršena niti izgradnja sanitarnog kolektora koja ovisi o dinamici izgradnje ceste.				
	naknada za razvoj vodoopskrbe i odvodnje	15.000	10.978	73,2	
	Hrvatske vode	35.000	37.055	105,9	
8.2.3.	<b>Aglomeracija Klana</b> - izrada projektne dokumentacije i gradnja	<b>1.020.000</b>	<b>1.015.646</b>	<b>99,6</b>	<b>451.161</b>
	Izrađena je projektna dokumentacija za naselja Klana i Studena (Idejna konceptijska rješenja). Započelo se je s izgradnjom HS Studena-Zavrh.				
	naknada za razvoj odvodnje Grobnik - Klana	1.020.000	1.015.646	99,6	
<b>8.3. Zajednički projekti vodoopskrbe i odvodnje</b>					
8.3.1.	<b>EU projekti - pripremna dokumentacija za EU fondove: Aglomeracija Rijeka (Rijeka, Kastav, Viškovo, Čavle, Jelenje)</b> - izrađena je Studija izvodljivosti s pripadajućim aplikacijskim obrascem koja je odobrena od strane Ministarstva zaštite okoliša i energetike (PT1) i Hrvatskih	<b>14.080.000</b>	<b>14.177.894</b>	<b>100,7</b>	<b>11.747.727</b>

Točka iz Izmjena plana	Razvojni zahvat	Izmjene plana 2017.	Utrošena / Doznačena sredstva 2017.	Indeks	Izvedeni radovi 2017.
1	2	3	4	5(4/3)	6
	<p>voda (PT2), te je dobiven „Completion note“ od JASPERS-a.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- nastavljena je izrada idejnih i glavnih projekata proširenja sustava distribucije, prikupljanja i odvodnje otpadnih voda za područje aglomeracije Rijeka sustav javne odvodnje "Grad"- 2. dio proširenja sustava na području grada Rijeke i grada Kastva te općina Viškovo, Jelenje, Čavle i Matulji. Isti su još u fazi provedbe ishodovanja građevinskih dozvola, te se očekuje završetak ugovora u prvoj polovici 2018. godine.</li> <li>- nastavljena je izrada idejnih i glavnih projekata za rekonstrukciju i dogradnju sustava na području aglomeracije Rijeka, sustav javne odvodnje "Grad". Isti su još u fazi provedbe ishodovanja građevinskih dozvola, te se očekuje završetak ugovora u prvoj polovici 2018. godine.</li> <li>- nastavljena je izrada natječajne dokumentacije za gradnju uređaja za pročišćavanje otpadnih voda aglomeracije Rijeka (UPOV Rijeka), usluge stručnog nadzora nad izvođenjem radova na UPOV-u Rijeka, gradnju sustava odvodnje, usluge nadzora nad izvođenjem radova na sustavu odvodnje, nabavu opreme, informiranje i vidljivost projekta, usluge upravljanja projektom. Isto je u provedbi, te se u prvoj polovici 2018. godine očekuje završetak pripadnih ugovora pripreme natječajne dokumentacije.</li> <li>- izrađena je novelacija matematičkog modela sustava odvodnje aglomeracije Rijeka.</li> <li>- obavljani su geotehnički istražni radovi na platou Delta.</li> </ul> <p><b><u>Aglomeracija Bakar-Kostrena</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- potpisan je sporazumni raskid ugovora sa ugovornim izrađivačem za izradu Studije izvodljivosti, studije utjecaja na okoliš i aplikacija za EU fondove za aglomeraciju Bakar-Kostrena</li> </ul> <p><b><u>Aglomeracija Bakar</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- izrađena je projektna dokumentacija za izradu konceptijskog idejnog rješenja sustava prikupljanja, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Bakar (predstudijski dokument).</li> <li>- započeta je izrada Elaborata opisa i grafičkog prikaza namjeravanog zahvata u prostoru za grad Bakar – sustav odvodnje s vlastitim UPOV-om.</li> <li>- započeta je izrada Elaborata zaštite okoliša za potrebu provedbe postupka o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat – Sustav vodoopskrbe i sustav odvodnje s vlastitim UPOV-om, Grad Bakar</li> <li>- izrada Studije izvodljivosti i radni dokument aplikacijskog obrasca aglomeracije Bakar – nije pokrenuta – planira se budući ugovor za aglomeraciju Bakar-Kostrena.</li> <li>- izrada recenzije Studije izvodljivosti aglomeracije Bakar – nije pokrenuta – planira se budući ugovor za aglomeraciju Bakar-Kostrena.</li> <li>- priprema dokumentacije za nadmetanje za odabir konzultanta/izrađivača tendera za izradu projektne dokumentacije za nadmetanje za UPOV 1. faza i obalni kolektor u Bakru – nije pokrenuta (budući ugovor).</li> <li>- izrada idejnog i glavnog projekta obalnog kolektora u</li> </ul>				

Točka iz Izmjena plana	Razvojni zahvat	Izmjene plana 2017.	Utrošena / Doznačena sredstva 2017.	Indeks	Izvedeni radovi 2017.
1	2	3	4	5(4/3)	6
	<p>Bakru sa svim pratećim objektima (CS, retencije, kišni preljevi, itd.), izrada idejnog projekta UPOV-a 1. faza u Bakru sa podmorskim ispustom sa elaboratom o potrebi procjene ocjene utjecaja na okoliš, izrada tendera za projektiranje i gradnju (UPOV 1. faza), izrada tendera za gradnju obalnog kolektora u Bakru sa svim pratećim objektima (CS, retencije, kišni preljevi, itd.), uslugu nadzora, uslugu promidžbe i vidljivosti, upravljanje projektom – nije pokrenuto (budući ugovor).</p> <p><b>Aglomeracija Kraljevica</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- nastavljena izrada Studije izvodljivosti, studije utjecaja na okoliš i aplikacije za EU fondove. Isto je u fazi provedbe s planiranim produžetkom roka do kraja 2018. godine iz razloga što je Grad Kraljevica u listopadu 2017.g. ugovorila izradu IV izmjene Prostornog plana bitne za izradu i provedbu studijskog dokumenta.</li> <li>- nastavljena izrada recenzije Studije izvodljivosti aglomeracije Kraljevica. Isto je u fazi provedbe s planiranim produžetkom roka do konačnog završetka izrade Studije izvodljivosti, odnosno do kraja 2018. godine.</li> <li>- potpisan ugovor za pružanje usluge provođenja terenskih mjerenja protoka za aglomeraciju Kraljevica.</li> <li>- priprema dokumentacije za nadmetanje za odabir konzultanta/izrađivača tendera za izradu projektne dokumentacije za nadmetanje za UPOV i proširenje mreže aglomeracije Kraljevica – nije pokrenuto (budući ugovor).</li> <li>- izrada idejnih i glavnih projekata proširenja mreže aglomeracije Kraljevica, izrada idejnog projekta UPOV-a u Kraljevici, izrada tendera za projektiranje i gradnju UPOV-a, izrada tendera za gradnju proširenja mreže aglomeracije Kraljevica, usluga nadzora, usluga promidžbe i vidljivosti, upravljanje projektom – nije pokrenuto (budući ugovor).</li> </ul> <p>Tijekom 2017. godine se nastavila imovinsko pravna priprema za gradnju / dogradnju sustava.</p>				
	Hrvatske vode	8.840.000	8.639.883	97,7	
	drugi izvor financiranja	5.240.000	5.538.011	105,7	
<b>8.3.2.</b>	<p><b>EU projekti</b></p> <p><b>- Projekt dogradnje sustava odvodnje aglomeracije Rijeka sa izgradnjom uređaja za pročišćavanje otpadnih voda - ugovaranje i pripremni radovi za početak izgradnje:</b></p> <p><b>-aglomeracija Rijeka (Rijeka, Kastav, Viškovo, Čavle, Jelenje)</b></p> <p>Ugovaranje i pripreme radnje se očekuju u drugoj polovici 2018. godine.</p>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	
	EU fond	0	0	-	
	Hrvatske vode	0	0	-	
	Državni proračun	0	0	-	
	drugi izvori financiranja (kredit)	0	0	-	



Točka iz Izmjena plana	Razvojni zahvat	Izmjene plana 2017.	Utrošena / Doznačena sredstva 2017.	Indeks	Izvedeni radovi 2017.
1	2	3	4	5(4/3)	6
8.3.3.	<p><b>EU projekt</b>  <b>- transportni kolektor K1</b>  Ugovaranje se planira u 2018. godini.</p> <p><b>- izvođenje dijela fekalne kanalizacije i rekonstrukcije vodovoda u sklopu izgradnje kružnog raskrižja Marinići 2</b>  Usljed sanacije raskrižja, a u zoni obuhvata istog, izveden je dio fekalne kanalizacije i rekonstruiran vodovod.</p> <p><b>- kolektor sanitarnih otpadnih voda u sklopu rekonstrukcije raskrižja Škurinjska draga</b>  Zbog sanacije raskrižja, a u zoni obuhvata istog, izgrađen je kolektor sanitarnih otpadnih voda.</p> <p><b>- rekonstrukcija prometnice Viškovo – Saršoni, I faza Mladenici - Ronjgi</b>  Započelo je projektiranje.</p>	1.835.000	1.660.762	90,5	1.750.152
	naknada za razvoj vodoopskrbe i odvodnje	1.835.000	1.660.762	90,5	
	drugi izvor financiranja (kredit)	0	0	0,0	
	<b>Izvori financiranja:</b>				
	naknada za razvoj vodoopskrbe i odvodnje	3.460.800	3.110.686	89,9	16.709.822
	naknada za razvoj odvodnje Grobnik - Klana	4.690.000	4.684.013	99,9	
	Hrvatske vode	12.891.000	12.688.329	98,4	
	Državni proračun	0	0	0,0	
	drugi izvor financiranja (kredit)	5.240.000	5.538.011	105,7	
	EU sredstva	0	0	0,0	
	PGŽ	300.000	300.000	100,0	
<b>SVEUKUPNO ZA RAZVOJNE ZAHVATE VODOOPSKRBE I ODVODNJE OTPADNIH VODA (I. PRIORITET)</b>		<b>26.581.800</b>	<b>26.321.040</b>	<b>99,0</b>	

## 8.2. ULAGANJA U PROJEKTE VODOOPSKRBE I ODVODNJE OD INTERESA ZA JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE FINANCIRANI IZ PRIPADAJUĆEG PREOSTALOG DIJELA NAKNADE ZA RAZVOJ I OSTALIH IZVORA (II. PRIORITET)

U sljedećim tablicama daje se prikaz utrošenih sredstava u 2017.g. u projekte vodoopskrbe i odvodnje od interesa za svaku jedinicu lokalne samouprave (II. prioritet) po izvorima financiranja i usporedba s Izmjenama i dopunama Plana za 2017.godinu te vrijednost izvršenih radova za 2017. godinu.

Tablica 4: UTROŠENA SREDSTVA U PROJEKTE II. PRIORITETA ZA 2017. GODINU U USPOREDBI S IZMJENAMA PLANA ZA 2017. GODINU I VRIJEDNOST IZVRŠENIH RADOVA U 2017. GODINI ZA **GRAD RIJEKU**

Naziv investicije / Točka iz Izmjene Plana 2017.	Izvori financiranja (u kn bez lipa)								Izvršeni radovi 2017.
	Naknada za razvoj		Hrvatske vode		EU sredstva		Ukupno 2017.		
	Izmjene Plana 2017.	Utrošena sredstva 2017.	Izmjene Plana 2017.	Sredstva za 2017.	Izmjene Plana 2017.	Doznačena sredstva 2017.	Izmjene Plana 2017.	Utrošena/ Doznačena sredstva 2017.	
1	2	3	4	5	6	7	8(2+4+6)	9(3+5+7)	10
<b>8.5.1. Projekti vodoopskrbe</b>									
1.Vodoopskrba stambenog područja Martinkovac - VS Dražice - priprema dokumentacije za gradnju	60.500	60.276					60.500	60.276	60.276
2. Vodovodni ogranak Bačići + RS – priprema dokumentacije za gradnju i gradnja	200.000	13.208					200.000	13.208	394.820
<b>Ukupno za projekte vodoopskrbe</b>	<b>260.500</b>	<b>73.484</b>					<b>260.500</b>	<b>73.484</b>	<b>455.096</b>
<b>8.6.1. Projekti odvodnje</b>									
1. CS Brajdica na Pećinama - priprema za gradnju	20.000	12.750					20.000	12.750	59.070
<b>Ukupno za projekte odvodnje</b>	<b>20.000</b>	<b>12.750</b>					<b>20.000</b>	<b>12.750</b>	<b>59.070</b>

Naziv investicije / Točka iz Izmjene Plana 2017.	Izvori financiranja (u kn bez lipa)								Izvršeni radovi 2017.
	Naknada za razvoj		Hrvatske vode		EU sredstva		Ukupno 2017.		
	Izmjene Plana 2017.	Utrošena sredstva 2017.	Izmjene Plana 2017.	Sredstva za 2017.	Izmjene Plana 2017.	Doznačena sredstva 2017.	Izmjene Plana 2017.	Utrošena/ Doznačena sredstva 2017.	
1	2	3	4	5	6	7	8(2+4+6)	9(3+5+7)	10
<b>8.7.1. Zajednički projekti vodoopskrbe i odvodnje</b>									
<b>1. Obveze po kreditu Europske banke za obnovu i razvoj (EBRD) i dodatni troškovi vezani uz realizaciju projekta</b>	<b>1.480.000</b>	<b>1.463.809</b>	<b>13.051.000</b>	<b>13.050.585</b>			<b>14.531.000</b>	<b>14.514.394</b>	<b>15.910</b>
<b>2. Financiranje Hrvatskih voda putem EIB - CEB programa - gradnja i dodatni troškovi vezani uz realizaciju projekta *</b>	<b>300.000</b>	<b>199.545</b>	<b>5.100</b>	<b>5.098</b>	<b>2.114.000</b>	<b>2.113.898</b>	<b>2.419.100</b>	<b>2.318.542</b>	<b>165.084</b>
<b>3. Priprema dokumentacije, ostali troškovi za dogradnju sustava vodnih građevina</b>	<b>85.000</b>	<b>37.562</b>					<b>85.000</b>	<b>37.562</b>	<b>37.169</b>
<b>4. Zajednička izgradnja na području Grada Rijeke – gradnja ogranaka vodovoda i kanalizacije u sklopu izgradnje prometnica, uređenja trgova i ostalih javnih površina sukladno prioritetima Grada Rijeke</b>	<b>1.812.700</b>	<b>1.778.973</b>					<b>1.812.700</b>	<b>1.778.973</b>	<b>1.453.771</b>
4.1. a) DTK instalacija za upravljanje sustavom vodovoda i kanalizacije - projekti	54.000	53.657					54.000	53.657	53.754
4.2. b) DTK instalacija za upravljanje sustavom vodovoda i kanalizacije - izvođenje	0	0					0	0	0
4.3. Kanalizacija i vodovod u ulici Kozala	359.000	357.059					359.000	357.059	82.335
4.4. Pavlinski trg	706.000	703.973					706.000	703.973	547.603

Naziv investicije / Točka iz Izmjene Plana 2017.	Izvori financiranja (u kn bez lipa)								Izvršeni radovi 2017.
	Naknada za razvoj		Hrvatske vode		EU sredstva		Ukupno 2017.		
	Izmjene Plana 2017.	Utrošena sredstva 2017.	Izmjene Plana 2017.	Sredstva za 2017.	Izmjene Plana 2017.	Doznačena sredstva 2017.	Izmjene Plana 2017.	Utrošena/ Doznačena sredstva 2017.	
1	2	3	4	5	6	7	8(2+4+6)	9(3+5+7)	10
4.5. Drenova - Streljana - cesta	200.000	169.851					200.000	169.851	254.171
4.6. Drenova - Streljana - Bok	291.500	264.339					291.500	264.339	290.220
4.7. a) OU4	0	0					0	0	0
4.8. b) Spojni cjevovod za UO4 (kanalizacija)	0	0					0	0	0
4.9. Vodotoranj Trsat (cesta Grad, spojna cesta, VT) projekt	30.000	210					30.000	210	210
4.10. Nogometni kamp Rujevica - I faza	0	0					0	0	0
4.11. Dio transportnog voda (Streljana - Brgudi - Brestovica) u sklopu izgradnje rotora na Martinkovcu	48.000	48.000					48.000	48.000	48.000
4.12. Park Pomerio i ulica Ivana Rendića - kanalizacija	100.000	158.611					100.000	158.611	177.132
4.13. Rekonstrukcija kolno pješačkog prilaza za zgrade branitelja I. faza	23.200	22.928					23.200	22.928	0
4.14. Bivši tvornički kompleks Benčić - vodoopskrba, fekalna odvodnja i pripadajuće elektroinstalacije	1.000	345					1.000	345	345
<b>5.Martinkovac - vodoopskrba i odvodnja</b>	<b>2.712.000</b>	<b>2.628.248</b>	<b>530.820</b>	<b>750.055</b>			<b>3.242.820</b>	<b>3.378.303</b>	<b>2.474.076</b>
5.1.Martinkovac - gradnja vodovoda i sanitarne kanalizacije	1.162.000	1.159.832	530.820	750.055			1.692.820	1.909.887	526.251

Naziv investicije / Točka iz Izmjene Plana 2017.	Izvori financiranja (u kn bez lipa)								Izvršeni radovi 2017.
	Naknada za razvoj		Hrvatske vode		EU sredstva		Ukupno 2017.		
	Izmjene Plana 2017.	Utrošena sredstva 2017.	Izmjene Plana 2017.	Sredstva za 2017.	Izmjene Plana 2017.	Doznačena sredstva 2017.	Izmjene Plana 2017.	Utrošena/ Doznačena sredstva 2017.	
1	2	3	4	5	6	7	8(2+4+6)	9(3+5+7)	10
5.2. Martinkovac - GU3	0						0	0	0
5.3. Martinkovac - instalacije	1.550.000	1.468.416					1.550.000	1.468.416	1.947.825
<b>6. Bodulovo - vodoopskrba i odvodnja</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>					<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6.1. Radna zona Bodulovo - gradnja vodovoda i kanalizacije	0	0					0	0	0
6.2. Spojni cjevovod Bodulovo - gradnja vodovoda	20.000	0					20.000	0	0
<b>7. Obveze po kreditu za Prioritete izgradnje (zajedničke) komunalne infrastrukture Grada Rijeke</b>	<b>5.105.000</b>	<b>5.098.824</b>					<b>5.105.000</b>	<b>5.098.824</b>	<b>0</b>
<b>Ukupno za zajedničke projekte vodoopskrbe i odvodnje</b>	<b>11.514.700</b>	<b>11.206.962</b>	<b>13.586.920</b>	<b>13.805.738</b>	<b>2.114.000</b>	<b>2.113.898</b>	<b>27.215.620</b>	<b>27.126.598</b>	<b>4.146.009</b>
<b>SVEUKUPNO PROJEKTI VODOOPSKRBE I ODVOJNJE</b>	<b>11.795.200</b>	<b>11.293.196</b>	<b>13.586.920</b>	<b>13.805.738</b>	<b>2.114.000</b>	<b>2.113.898</b>	<b>27.496.120</b>	<b>27.212.832</b>	<b>4.660.176</b>

\* **Napomena:** Točka 8.7.1.2. obuhvaća gradnju/rekonstrukciju sanitarne kanalizacije i vodovoda na sljedećim investicijskim projektima : Donja Drenova /sjeverni dio, Gornji Zamet/Zona Z-2 , Gornji Zamet/Zona Z-3, Murini i rekonstrukciju CS Kostabela s pripadajućom kanalizacijom. Projekt je sufinanciran od strane Hrvatskih voda u 90% iznosu tijekom 2015. i 2016. godine – EIB/CEB program, dok je preostalih 10% sredstava osiguralo Društvo iz sredstava naknade za razvoj vodoopskrbe i odvodnje grada Rijeke. Za projekt su potom odobrena sredstva EU fondova te su sukladno zahtjevu za nadoknadom utrošenih sredstava, EU fondovi dodjelili bespovratna sredstva u iznosu od 2.113.898 kn od čega su početkom 2017. godine doznačena sredstva Hrvatskima vodama u iznosu od 1.367.289 kn , a Društvu sredstva u iznosu od 746.609 kn. Time sveukupno dobivena bespovratna sredstva iz EU fondova tijekom 2016. i 2017. godine za navedeni projekt iznose 14.666.037 kn.

Tablica 5: UTROŠENA SREDSTVA U PROJEKTE II. PRIORITETA U 2017. GODINI U USPOREDBI S IZMJENAMA PLANA ZA 2017. GODINU I VRIJEDNOST IZVRŠENIH RADOVA U 2017. GODINI ZA **GRAD BAKAR**

Naziv investicije / Točka iz Izmjene Plana 2017.	Izvori financiranja (u kn bez lipa)								Izvršeni radovi 2017.
	Naknada za razvoj		Proračun		Hrvatske vode		Ukupno 2017.		
	Izmjene Plana 2017.	Utrošena sredstva 2017.	Izmjene Plana 2017.	Sredstva za 2017.	Izmjene Plana 2017.	Doznačena sredstva 2017.	Izmjene Plana 2017.	Utrošena/ Doznačena sredstva 2017.	
1	2	3	4	5	6	7	8(2+4+6)	9(3+5+7)	10
<b>8.5.2. Projekti vodoopskrbe</b>									
1.Vodoopskrba naselja Melnice u Gradu Bakru - II faza -priprema i početak gradnje	0	0					0	0	0
2.Škrljevo 1- priprema dokumentacije za gradnju vodovodnog ogranka	364.000	363.540					364.000	363.540	361.277
3. Kukuljanovo 152 (160)- priprema dokumentacije za gradnju vodovodnog ogranka	196.000	195.115					196.000	195.115	195.115
4. Škrljevo 244-223 - priprema dokumentacije za gradnju vodovodnog ogranka	38.600	15.400					38.600	15.400	15.400
5. Hreljin 49a-49c - priprema dokumentacije za gradnju vodovodnog ogranka	13.800	5.600					13.800	5.600	5.600
6. Hreljin 58b-71b - priprema dokumentacije za gradnju vodovodnog ogranka	4.700	0					4.700	0	5.600
7. Prijelazni troškovi projektiranja	0	0					0	0	0
8. Vodovodne instalacije u sklopu rekonstrukcije državne ceste D501 - Oštrovica - Meja	69.500	0					69.500	0	0
9. Veberova - početak gradnje vodovodnog ogranka	10.000	0					10.000	0	4.850
<b>SVEUKUPNO PROJEKTI VODOOPSKRBE</b>	<b>696.600</b>	<b>579.655</b>					<b>696.600</b>	<b>579.655</b>	<b>587.842</b>

Tablica 6: UTROŠENA SREDSTVA U PROJEKTE II. PRIORITETA U 2017. GODINI U USPOREDBI S IZMJENAMA PLANA ZA 2017. GODINU I VRIJEDNOST IZVRŠENIH RADOVA U 2017. GODINI ZA **GRAD KASTAV**

Naziv investicije / Točka iz Izmjene Plana 2017.	Izvori financiranja (u kn bez lipa)								Izvršeni radovi 2017.
	Naknada za razvoj		Hrvatske vode		EU sredstva		Ukupno 2017.		
	Izmjene Plana 2017.	Utrošena sredstva 2017.	Izmjene Plana 2017.	Sredstva za 2017.	Izmjene Plana 2017.	Doznačena sredstva 2017.	Izmjene Plana 2017.	Utrošena/ Doznačena sredstva 2017.	
1	2	3	4	5	6	7	8(2+4+6)	9(3+5+7)	10
<b>8.5.3. Projekti vodoopskrbe</b>									
1. Troškovi projektiranja (ogranici) i troškovi vezani uz kandidiranje prema EU fondovima*	70	70	210	207	3.497.000	3.495.956	3.497.280	3.496.233	0
2. Kudeji-Rupnjak - vodovodni ogranak - priprema dokumentacije za gradnju (664+RS)	67.000	56.438					67.000	56.438	56.438
3. Žegoti - vodovodni ogranak - priprema dokumentacije za gradnju	28.000	18.897					28.000	18.897	18.547
4. Krajevac - Brnčići - vodovodni ogranak - priprema dokumentacije za gradnju	43.000	33.937					43.000	33.937	24.537
5. Ulica Brozovo - vodovodni ogranak - priprema dokumentacije za gradnju	33.500	33.496					33.500	33.496	33.496
6. Gorice - vodovodni ogranak - priprema dokumentacije za gradnju	37.000	36.415					37.000	36.415	36.415
7. Jurčićeva ulica - vodovodni ogranak - priprema dokumentacije za gradnju	28.000	27.935					28.000	27.935	27.935
8. Vodovodni ogranak - gradnja	0	0					0	0	0

Naziv investicije / Točka iz Izmjene Plana 2017.	Izvori financiranja (u kn bez lipa)								Izvršeni radovi 2017.
	Naknada za razvoj		Hrvatske vode		EU sredstva		Ukupno 2017.		
	Izmjene Plana 2017.	Utrošena sredstva 2017.	Izmjene Plana 2017.	Sredstva za 2017.	Izmjene Plana 2017.	Doznačena sredstva 2017.	Izmjene Plana 2017.	Utrošena/ Doznačena sredstva 2017.	
1	2	3	4	5	6	7	8(2+4+6)	9(3+5+7)	10
9. Žegoti kod 26 - vodovodni ogranak - priprema dokumentacije za gradnju	11.650	11.650					11.650	11.650	21.600
10. Jelušići od kbr.7 do kbr.9- vodovodni ogranak - priprema dokumentacije za gradnju	0	0					0	0	0
<b>Ukupno za projekte vodoopskrbe</b>	<b>248.220</b>	<b>218.838</b>	<b>210</b>	<b>207</b>	<b>3.497.000</b>	<b>3.495.956</b>	<b>3.745.430</b>	<b>3.715.001</b>	<b>218.968</b>
<b>8.7.3. Zajednički projekti vodoopskrbe i odvodnje</b>									
1. Obveze po kreditu Europske banke za obnovu i razvoj(EBRD)	45.000	44.847	404.000	403.626			449.000	448.474	0
2. Put Vladimira Nazora u staroj jezgri grada Kastva - ogranak kanalizacije i vodovoda - gradnja V=148 (111+37) K=122 (92+30)	350.000	178.857					350.000	178.857	438.137
<b>Ukupno za zajedničke projekte vodoopskrbe i odvodnje</b>	<b>395.000</b>	<b>223.704</b>	<b>404.000</b>	<b>403.626</b>			<b>799.000</b>	<b>627.331</b>	<b>438.137</b>
<b>SVEUKUPNO PROJEKTI VODOOPSKRBE I ODVODNJE</b>	<b>643.220</b>	<b>442.543</b>	<b>404.210</b>	<b>403.833</b>	<b>3.497.000</b>	<b>3.495.956</b>	<b>4.544.430</b>	<b>4.342.332</b>	<b>657.105</b>

**\*Napomena:** Točka br. 1 sadrži projekt „Proširenja vodovodne infrastrukture u gradu Kastvu“ koji obuhvaća ogranke : Donji Turki (Gec) , Kastav-Klanci, Kostanj (Jurčići - Škrliji), Donji Spinčići od kbr.124-126, Krajevac, Šporeri, Brnčići 5-9/1, Donji Turki i Brnčići put Martići . Navedeni projekt je sufinanciran od strane Hrvatskih voda u 90% iznosu tijekom 2015. i 2016. godine u sklopu EIB/CEB programa, dok je preostalih 10% sredstava osiguralo Društvo iz naknade za razvoj vodoopskrbe i odvodnje grada Kastva. Za projekt su potom odobrena sredstva EU fondova te su sukladno zahtjevu za nadoknadom utrošenih sredstava, EU fondovi dodjelili bespovratna sredstva za navedeni projekt u iznosu od 3.492.437 kn od čega su Hrvatskim vodama doznačena sredstva u iznosu od 3.263.561 kn , a Društvu sredstva u iznosu od 228.876 kn.



Tablica 7: UTROŠENA SREDSTVA U PROJEKTE II. PRIORITETA U 2017. GODINI U USPOREDBI S IZMJENAMA PLANA ZA 2017. GODINU I VRIJEDNOST IZVRŠENIH RADOVA U 2017. GODINI ZA **GRAD KRALJEVICU**

Naziv investicije / Točka iz Izmjene Plana 2017.	Izvori financiranja (u kn bez lipa)								Izvršeni radovi 2017.
	Naknada za razvoj		Proračun		Hrvatske vode		Ukupno 2017.		
	Izmjene Plana 2017.	Utrošena sredstva 2017.	Izmjene Plana 2017.	Doznačena sredstva 2017.	Izmjene Plana 2017.	Sredstva za 2017.	Izmjene Plana 2017.	Utrošena/ Doznačena sredstva 2017.	
1	2	3	4	5	6	7	8 (2+4+6)	9 (3+5+7)	10
<b>8.5.4. Projekti vodoopskrbe</b>									
1.Vodovodni ogranak Burićeva-Putretin u Šmriki - priprema za gradnju	22.700	19.290					22.700	19.290	19.290
2. Prijelazni troškovi projektiranja	4.100	4.050					4.100	4.050	4.050
<b>Ukupno za projekte vodoopskrbe</b>	<b>26.800</b>	<b>23.340</b>					<b>26.800</b>	<b>23.340</b>	<b>23.340</b>
<b>8.7.4. Zajednički projekti vodoopskrbe i odvodnje</b>									
1.Vodovodna i kanalizacijska mreža <b>Jakovčičeve ulice (dio u cesti)</b> - projektiranje	0	0					0	0	0
2.Vodovodna i kanalizacijska mreža <b>Jakovčičeve ulice - II dio</b> - projektiranje i gradnja	1.050.000	852.960					1.050.000	852.960	1.030.188
3.Pod Banj - pristupna cesta - I faza - priprema za gradnju i gradnja V=150 K=150	260.000	212.487					260.000	212.487	386.279
4.Pod Banj - pristupna cesta - II faza - priprema za gradnju V=370 K=370	0	0					0	0	0
<b>Ukupno za zajedničke projekte vodoopskrbe i odvodnje</b>	<b>1.310.000</b>	<b>1.065.447</b>					<b>1.310.000</b>	<b>1.065.447</b>	<b>1.416.467</b>
<b>SVEUKUPNO PROJEKTI VODOOPSKRBE I ODVODNJE</b>	<b>1.336.800</b>	<b>1.088.787</b>					<b>1.336.800</b>	<b>1.088.787</b>	<b>1.439.807</b>

Tablica 8: UTROŠENA SREDSTVA U PROJEKTE II. PRIORITETA U 2017. GODINI U USPOREDBI S IZMJENAMA PLANA ZA 2017. GODINU I VRIJEDNOST IZVRŠENIH RADOVA U 2017. GODINI ZA **OPĆINU KOSTRENA**

Naziv investicije / Točka iz Izmjene Plana 2017.	Izvori financiranja (u kn bez lipa)								Izvršeni radovi 2017.
	Naknada za razvoj		Proračun		Hrvatske vode		Ukupno 2017.		
	Izmjene Plana 2017.	Utrošena sredstva 2017.	Izmjene Plana 2017.	Doznačena sredstva 2017.	Izmjene Plana 2017.	Sredstva za 2017.	Izmjene Plana 2017.	Utrošena/ Doznačena sredstva 2017.	
1	2	3	4	5	6	7	8(2+4+6)	9(3+5+7)	10
<b>8.5.5. Projekti vodoopskrbe</b>									
1.Vodosprema s hidroforskom stanicom Solin 2 - gradnja 300 m3	1.100	1.020					1.100	1.020	1.020
2. Vodovodni ogranci naselja Glavani - Ledine - Šubati -Raspelje - nastavak izvođenja (2360+1100+510)	365.000	367.633			2.927.000	3.034.031	3.292.000	3.401.665	2.170.316
3.Rekonstrukcija i građenje tlačnog vodovodnog cjevovoda CS Martinšćica-VS Glavani i tlačno opskrbnog vodovodnog cjevovoda VS Glavani -VS Solin, dionica Mažeri-Glavani (660+650)	377.100	377.669			2.894.000	2.996.097	3.271.100	3.373.766	2.203.362
4.Rekonstrukcija i gradnja tlačnog vodovodnog cjevovoda CS Martinšćica-VS Glavani, dionica Martinšćica-Mažeri (210+680)	123.000	124.143			686.000	805.759	809.000	929.902	455.230
5. Vodovodni ogranak - Sv.Lucija + RS - početak gradnje	5.000	4.450					5.000	4.450	4.450
<b>Ukupno za projekte vodoopskrbe</b>	<b>871.200</b>	<b>874.915</b>			<b>6.507.000</b>	<b>6.835.887</b>	<b>7.378.200</b>	<b>7.710.802</b>	<b>4.834.378</b>
<b>8.7.5. Zajednički projekti vodoopskrbe i odvodnje</b>									
1. Vodovod i kanalizacija u naselju Doričići - priprema dokumentacije za gradnju	46.200	46.180					46.200	46.180	46.180

Naziv investicije / Točka iz Izmjene Plana 2017.	Izvori financiranja (u kn bez lipa)								Izvršeni radovi 2017.
	Naknada za razvoj		Proračun		Hrvatske vode		Ukupno 2017.		
	Izmjene Plana 2017.	Utrošena sredstva 2017.	Izmjene Plana 2017.	Doznačena sredstva 2017.	Izmjene Plana 2017.	Sredstva za 2017.	Izmjene Plana 2017.	Utrošena/ Doznačena sredstva 2017.	
1	2	3	4	5	6	7	8(2+4+6)	9(3+5+7)	10
2. Dom za starije osobe u Kostreni - vodovod i kanalizacija - priprema dokumentacije za gradnju i početak gradnje (V=380, K=270)	25.700	25.700					25.700	25.700	25.700
3. Žuknica - vodovod i kanalizacija - priprema dokumentacije za gradnju (V=140, K=140)	7.500	0					7.500	0	0
4. Sv.Lucija-Ive Šodića 16/A - vodovod i kanalizacija - priprema dokumentacije za gradnju (V=40, K=40)	6.800	16.700					6.800	16.700	16.700
5. I faza ceste Rožići - vodovod i kanalizacija u sklopu ceste -gradnja	0	0					0	0	0
6. Vodovod i kanalizacija Autokamp Paveki (V=270, K=230)	25.000	24.750					25.000	24.750	24.750
<b>Ukupno za zajedničke projekte vodoopskrbe i odvodnje</b>	<b>111.200</b>	<b>113.330</b>					<b>111.200</b>	<b>113.330</b>	<b>113.330</b>
<b>SVEUKUPNO PROJEKTI VODOOPSKRBE I ODVODNJE</b>	<b>982.400</b>	<b>988.245</b>			<b>6.507.000</b>	<b>6.835.887</b>	<b>7.489.400</b>	<b>7.824.132</b>	<b>4.947.708</b>

Tablica 9: UTROŠENA SREDSTVA U PROJEKTE II. PRIORITETA U 2017. GODINI U USPOREDBI S IZMJENAMA PLANA ZA 2017. GODINU I VRIJEDNOST IZVRŠENIH RADOVA U 2017. GODINI ZA **OPĆINU ČAVLE**

Naziv investicije / Točka iz Izmjene Plana 2017.	Izvori financiranja (u kn bez lipa)								Izvršeni radovi 2017.
	Naknada za razvoj		Proračun		Hrvatske vode		Ukupno 2017.		
	Izmjene Plana 2017.	Utrošena sredstva 2017.	Izmjene Plana 2017.	Doznačena sredstva 2017.	Izmjene Plana 2017.	Sredstva za 2017.	Izmjene Plana 2017.	Utrošena/ Doznačena sredstva 2017.	
1	2	3	4	5	6	7	8(2+4+6)	9(3+5+7)	10
<b>8.5.6. Projekti vodoopskrbe</b>									
1. Vodovodni ogranak Gorica - priprema dokumentacije za gradnju i gradnja	0	0					0	0	0
2. Vodovodni ogranak Mavrinci 53/1 - priprema dokumentacije za gradnju i gradnja	14.550	210					14.550	210	210
3. Vodovodni ogranak Pribijine - priprema dokumentacije za gradnju	7.410	7.410					7.410	7.410	7.410
<b>Ukupno za projekte vodoopskrbe</b>	<b>21.960</b>	<b>7.620</b>					<b>21.960</b>	<b>7.620</b>	<b>7.620</b>
<b>8.7.6. Zajednički projekti vodoopskrbe i odvodnje</b>									
1. Baredine - priprema dokumentacije za gradnju (V=300, K=400)	0	0					0	0	0
<b>Ukupno za zajedničke projekte vodoopskrbe i odvodnje</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>SVEUKUPNO PROJEKTI VODOOPSKRBE I ODVODNJE</b>	<b>21.960</b>	<b>7.620</b>					<b>21.960</b>	<b>7.620</b>	<b>7.620</b>

Tablica 10: UTROŠENA SREDSTVA U PROJEKTE II. PRIORITETA U 2017. GODINI U USPOREDBI S IZMJENAMA PLANA ZA 2017. GODINU I VRIJEDNOST IZVRŠENIH RADOVA U 2017. GODINI ZA **OPĆINU VIŠKOVO**

Naziv investicije / Točka iz Izmjene Plana 2017.	Izvori financiranja (u kn bez lipa)								Izvršeni radovi 2017.
	Naknada za razvoj		Proračun		Hrvatske vode		Ukupno 2017.		
	Izmjene Plana 2017.	Utrošena sredstva 2017.	Izmjene Plana 2017.	Doznačena sredstva 2017.	Izmjene Plana 2017.	Sredstva za 2017.	Izmjene Plana 2017.	Utrošena/ Doznačena sredstva 2017.	
1	2	3	4	5	6	7	8 (2+4+6)	9(3+5+7)	10
<b>8.5.7. Projekti vodoopskrbe</b>									
1.Donji Jugi - gradnja vodovodnog ogranka	145.000	69.239					145.000	69.239	122.558
2. Viškovo prema Adriametalu i Mladenići 19 - gradnja vodovodnog ogranka	9.000	8.536					9.000	8.536	950
3. Gornji Jugi 44/1-44a - gradnja vodovodnog ogranka*	117.000	116.437			200.000	202.490	317.000	318.927	2.435
4.Pogled - Vrtače V2 - gradnja vodovodnog ogranka	760.000	756.273					760.000	756.273	756.070
5.Naselje Kliči - gradnja vodovodnog ogranka	1.010.000	1.011.387					1.010.000	1.011.387	1.380.509
6.Lučići, Zorzići i novi dio Zorzići od k.br.64- 70 - gradnja vodovodnog ogranka	200.000	77.961					200.000	77.961	177.224
7.Garići - Petrolejska - gradnja vodovodnog ogranka	3.500	3.269					3.500	3.269	0
8.Perčevo- gradnja vodovodnog ogranka	0	0					0	0	0
9.Vozišće k.br.48-61 - gradnja vodovodnog ogranka	380.000	367.003					380.000	367.003	400.218
10.Ronjgi - gradnja vodovodnog ogranka	0	0					0	0	0
11.Trtni - Juraši - gradnja vodovodnog ogranka	7.300	3.666					7.300	3.666	3.666
12. Juraši NN - priprema dokumentacije za gradnju vodovodnog ogranka	5.100	5.066					5.100	5.066	0

Naziv investicije / Točka iz Izmjene Plana 2017.	Izvori financiranja (u kn bez lipa)								Izvršeni radovi 2017.
	Naknada za razvoj		Proračun		Hrvatske vode		Ukupno 2017.		
	Izmjene Plana 2017.	Utrošena sredstva 2017.	Izmjene Plana 2017.	Doznačena sredstva 2017.	Izmjene Plana 2017.	Sredstva za 2017.	Izmjene Plana 2017.	Utrošena/ Doznačena sredstva 2017.	
1	2	3	4	5	6	7	8 (2+4+6)	9(3+5+7)	10
13.Bujki 1-47 - priprema dokumentacije za gradnju vodovodnog ogranka	7.600	7.509					7.600	7.509	0
14.Biškupi - priprema dokumentacije za gradnju vodovodnog ogranka	10.000	1.902					10.000	1.902	26.600
15.Juraši - priprema dokumentacije za gradnju vodovodnog ogranka	10.000	1.652					10.000	1.652	20.752
16.Bezjaki - priprema dokumentacije za gradnju vodovodnog ogranka	13.200	13.194					13.200	13.194	13.194
17.Marinići - priprema dokumentacije za gradnju vodovodnog ogranka	31.600	31.555					31.600	31.555	48.555
18.Furićevo 62 ABCD - priprema dokumentacije za gradnju vodovodnog ogranka	8.600	8.511					8.600	8.511	6.200
19.Marinići 29d - priprema dokumentacije za gradnju vodovodnog ogranka	12.000	18.251					12.000	18.251	18.251
20.Blažići - priprema dokumentacije za gradnju vodovodnog ogranka	28.200	28.107					28.200	28.107	28.107
21.Marinići 140-142 a - priprema dokumentacije za gradnju vodovodnog ogranka	16.200	15.152					16.200	15.152	15.152
22.Bezjaki 19-24 - priprema dokumentacije za gradnju vodovodnog ogranka	5.100	5.097					5.100	5.097	847
23.Vrtače - Kosi - priprema dokumentacije za gradnju vodovodnog ogranka	10.000	9.964					10.000	9.964	9.964
24.Donji Sroki - priprema dokumentacije za gradnju vodovodnog ogranka	42.100	42.084					42.100	42.084	42.084

Naziv investicije / Točka iz Izmjene Plana 2017.	Izvori financiranja (u kn bez lipa)								Izvršeni radovi 2017.
	Naknada za razvoj		Proračun		Hrvatske vode		Ukupno 2017.		
	Izmjene Plana 2017.	Utrošena sredstva 2017.	Izmjene Plana 2017.	Doznačena sredstva 2017.	Izmjene Plana 2017.	Sredstva za 2017.	Izmjene Plana 2017.	Utrošena/ Doznačena sredstva 2017.	
1	2	3	4	5	6	7	8 (2+4+6)	9(3+5+7)	10
25.Dovičići - priprema dokumentacije za gradnju vodovodnog ogranka	15.000	5.470					15.000	5.470	5.470
26.Dovičići II - priprema dokumentacije za gradnju vodovodnog ogranka	2.300	1.672					2.300	1.672	4.985
27.Stupari kod 40 - priprema dokumentacije za gradnju vodovodnog ogranka	12.700	12.569					12.700	12.569	12.669
28.Stupari kod 33 - priprema dokumentacije za gradnju vodovodnog ogranka	11.400	11.400					11.400	11.400	11.400
29.Stupari - Straža - priprema dokumentacije za gradnju vodovodnog ogranka	27.400	27.375					27.400	27.375	27.076
30.Marčelji 100 - gradnja vodovodnog ogranka	300.000	301.140					300.000	301.140	1.271.794
31.Prijelazni troškovi projektiranja	6.600	6.503					6.600	6.503	3.675
32. Donji Jugi do kbr. 5 - priprema dokumentacije za gradnju vodovodnog ogranka	10.000	4.200					10.000	4.200	5.500
<b>Ukupno za projekte vodoopskrbe</b>	<b>3.216.900</b>	<b>2.972.140</b>			<b>200.000</b>	<b>202.490</b>	<b>3.416.900</b>	<b>3.174.630</b>	<b>4.415.904</b>

**\*Napomena:** Pri gradnji vodovodnog ogranka Gornji Jugi 44/1-44a ( točka 8.5.7.4.) bilo je potrebno izvršiti i radove na odvodnji koji su iz naknade za razvoj vodoopskrbe i odvodnje plaćeni u iznosu od 62.637 kn , a Hrvatske vode su predmetne radove sufinancirale u iznosu od 91.910 kn. Vrijednost izvršenih radova na odvodnji iznosi 154.547 kn.

Tablica 11: UTROŠENA SREDSTVA U PROJEKTE II. PRIORITETA U 2017. GODINI U USPOREDBI S IZMJENAMA PLANA ZA 2017. GODINU I VRIJEDNOST IZVRŠENIH RADOVA U 2017. GODINI ZA **OPĆINU JELENJE**

Naziv investicije / Točka iz Izmjene Plana 2017.	Izvori financiranja (u kn bez lipa)								Izvršeni radovi 2017.
	Naknada za razvoj		Proračun		Hrvatske vode		Ukupno 2017.		
	Izmjene Plana 2017.	Utrošena sredstva 2017.	Izmjene Plana 2017.	Doznačena sredstva 2017.	Izmjene Plana 2017.	Sredstva za 2017.	Izmjene Plana 2017.	Utrošena/ Doznačena sredstva 2017.	
1	2	3	4	5	6	7	8(2+4+6)	9(3+5+7)	10
<b>8.5.8. Projekti vodoopskrbe</b>									
1.Linčetovo - gradnja vodovodnog ogranka	400.000	204.327					400.000	204.327	406.207
2. Prijelazni troškovi projektiranja	3.500	4.674					3.500	4.674	6.774
<b>Ukupno za projekte vodoopskrbe</b>	<b>403.500</b>	<b>209.001</b>					<b>403.500</b>	<b>209.001</b>	<b>412.981</b>



Tablica 12: UTROŠENA SREDSTVA U PROJEKTE II. PRIORITETA U 2017. GODINI U USPOREDBI S IZMJENAMA PLANA ZA 2017. GODINU I VRIJEDNOST IZVRŠENIH RADOVA U 2017. GODINI ZA **OPĆINU KLANA**

Naziv investicije / Točka iz Izmjene Plana 2017.	Izvori financiranja (u kn bez lipa)								Izvršeni radovi 2017.
	Naknada za razvoj		Proračun		Hrvatske vode		Ukupno 2017.		
	Izmjene Plana 2017.	Utrošena sredstva 2017.	Izmjene Plana 2017.	Doznačena sredstva 2017.	Izmjene Plana 2017.	Sredstva za 2017.	Izmjene Plana 2017.	Utrošena/ Doznačena sredstva 2017.	
1	2	3	4	5	6	7	8(2+4+6)	9(3+5+7)	10
<b>8.5.9. Projekti vodoopskrbe</b>									
1. Kalužica od k.br. 31-38-priprema dokumentacije za gradnju	8.300	8.300					8.300	8.300	8.300
2. Lisac-Vojarna - vodovodni ogranak - priprema dokumentacije za gradnju	10.600	10.600					10.600	10.600	10.600
3. Breza-Pilana Breza vodovodni ogranak - priprema dokumentacije za gradnju	16.100	16.050					16.100	16.050	16.050
4. Klana - Pilana + CS - vodovodni ogranak - priprema dokumentacije za gradnju	0	0					0	0	0
<b>Ukupno za projekte vodoopskrbe</b>	<b>35.000</b>	<b>34.950</b>					<b>35.000</b>	<b>34.950</b>	<b>34.950</b>

Tablica 13: REKAPITULACIJA UTROŠENIH SREDSTAVA PO IZVORIMA FINANCIRANJA U PROJEKTE VODOOPSKRBE I ODVODNJE II. PRIORITETA U 2017. GODINI U USPOREDBI S IZMJENAMA PLANA ZA 2017. GODINU I IZVRŠENI RADOVI U 2017. GODINE ZA SVAKU JLS

(u kn bez lipa)

Grad/ Općina	Naziv investicije	Naknada za razvoj		Hrvatske vode		EU sredstva		Ukupno 2017.		Izvršeni radovi 2017.
		Izmjene Plana 2017.	Utrošena sredstva 2017.	Izmjene Plana 2017.	Financiranje 2017.	Izmjene Plana 2017.	Doznačena sredstva 2017.	Izmjene Plana 2017.	Utrošena/ Doznačena sredstva 2017.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9 (3+5+7)	10 (4+6+8)	11
Rijeka	Ukupno projekti vodoopskrbe i odvodnje	11.795.200	11.293.196	13.586.920	13.805.738	2.114.000	2.113.898	27.496.120	27.212.832	4.660.176
Bakar	Ukupno projekti vodoopskrbe	696.600	579.655	-	-	-	-	696.600	579.655	587.842
Kastav	Ukupno projekti vodoopskrbe i odvodnje	643.220	442.543	404.210	403.833	3.497.000	3.495.956	4.544.430	4.342.332	657.105
Kraljevica	Ukupno projekti vodoopskrbe i odvodnje	1.336.800	1.088.787	-	-	-	-	1.336.800	1.088.787	1.439.807
Kostrena	Ukupno projekti vodoopskrbe i odvodnje	982.400	988.245	6.507.000	6.835.887	-	-	7.489.400	7.824.132	4.947.708
Čavle	Ukupno projekti vodoopskrbe i odvodnje	21.960	7.620	-	-	-	-	21.960	7.620	7.620
Viškovo	Ukupno projekti vodoopskrbe	3.216.900	2.972.140	200.000	202.490	-	-	3.416.900	3.174.630	4.415.904
Jelenje	Ukupno projekti vodoopskrbe	403.500	209.001	-	-	-	-	403.500	209.001	412.981
Klana	Ukupno projekti vodoopskrbe	35.000	34.950	-	-	-	-	35.000	34.950	34.950
<b>SVEUKUPNO PROJEKTI VODOOPSKRBE I ODVODNJE</b>		<b>19.131.580</b>	<b>17.616.136</b>	<b>20.698.130</b>	<b>21.247.949</b>	<b>5.611.000</b>	<b>5.609.854</b>	<b>45.440.710</b>	<b>44.473.939</b>	<b>17.164.092</b>

## SAŽETAK

8. GRADNJA KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA I KORIŠTENJE SREDSTAVA NAKNADE ZA RAZVOJ TE OSTALIH IZVORA FINANCIRANJA				
I. PRIORITET				
Razvojni zahvati	Planirana sredstva (iz svih izvora) po Izmjenama Plana 2017.	Utrošena sredstva (iz svih izvora) ostvarenje 2017.	% realizacija Izmjene Plana 2017.	Izvršeni radovi 2017.
vodoopskrba	2.881.800,00	2.709.838,99	94,0	2.712.749,15
odvodnja	7.785.000,00	7.772.544,46	99,8	499.193,78
zajednički razvojni zahvat vodoopskrbe i odvodnje	15.915.000,00	15.838.656,22	99,5	13.497.878,79
<b>Ukupno</b>	<b>26.581.800,00</b>	<b>26.321.039,67</b>	<b>99,0</b>	<b>16.709.821,72</b>
II. PRIORITET				
Grad/Općina	Planirana sredstva (iz svih izvora) po Izmjenama Plana 2017.	Utrošena sredstva (iz svih izvora) ostvarenje 2017.	% realizacije Izmjene Plana 2017.	Izvršeni radovi 2017.
Rijeka	27.496.120,00	27.212.832,29	99,0	4.660.175,56
Bakar	696.600,00	579.654,67	83,2	587.842,17
Kastav	4.544.430,00	4.342.331,98	95,6	657.105,24
Kraljevica	1.336.800,00	1.088.786,98	81,4	1.439.806,58
Kostrena	7.489.400,00	7.824.132,16	104,5	4.947.708,32
Čavle	21.960,00	7.620,00	34,7	7.620,00
Viškovo	3.416.900,00	3.174.630,46	92,9	4.415.903,85
Jelenje	403.500,00	209.000,70	51,8	412.980,74
Klana	35.000,00	34.950,00	99,9	34.950,00
<b>Ukupno</b>	<b>45.440.710,00</b>	<b>44.473.939,24</b>	<b>97,9</b>	<b>17.164.092,46</b>
<b>Sveukupno (I. + II. PRIORITET)</b>	<b>72.022.510,00</b>	<b>70.794.978,91</b>	<b>98,3</b>	<b>33.873.914,18</b>
