



Komunalno društvo  
**VODOVOD I KANALIZACIJA** d.o.o.  
za vodoopskrbu i odvodnju Rijeka

Dolac 14, 51000 Rijeka  
MB 3331903 OIB 80805858278

T: (051) 353 222 F: (051) 353 207  
E: [kdvik-rijeka@kdvik-rijeka.hr](mailto:kdvik-rijeka@kdvik-rijeka.hr)  
[www.kdvik-rijeka.hr](http://www.kdvik-rijeka.hr)

**GRADNJA KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA I  
KORIŠTENJE SREDSTAVA NAKNADE ZA RAZVOJ TE  
OSTALIH IZVORA FINANCIRANJA**

***IZVJEŠTAJ ZA 2016. GODINU***

Rijeka, travanj 2017.

## SADRŽAJ

### **8. GRADNJA KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA I KORIŠTENJE SREDSTAVA NAKNADE ZA RAZVOJ TE OSTALIH IZVORA FINANCIRANJA..... 3**

8.1. RAZVOJNI ZAHVATI VODOOPSKRBE I ODVODNJE OTPADNIH VODA OD ZAJEDNIČKOG INTERESA SUVLASNIKA DRUŠTVA I ISPORUČITELJA VODNE USLUGE (I. PRIORITET)..... 5

8.2. ULAGANJA U PROJEKTE VODOOPSKRBE I ODVODNJE OD INTERESA ZA JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE FINANCIRANI IZ PRIPADAJUĆEG PREOSTALOG DIJELA NAKNADE ZA RAZVOJ I OSTALIH IZVORA (II. PRIORITET) ..... 10

8.2.1. FINANCIRANJE RAZVOJNIH ZAHVATA VODOOPSKRBE I ODVODNJE OTPADNIH VODA PUTEM EUROPSKE BANKE ZA OBNOVU I RAZVOJ (EBRD) ..... 31

SAŽETAK .....32

## 8. GRADNJA KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA I KORIŠTENJE SREDSTAVA NAKNADE ZA RAZVOJ TE OSTALIH IZVORA FINANCIRANJA

Gradnja komunalnih vodnih građevina obuhvaća: projekte vodoopskrbe i odvodnje od zajedničkog interesa suvlasnika Društva i od značaja za funkcioniranje i unapređenje sustava vodoopskrbe i odvodnje financirane iz naknade za razvoj i ostalih izvora (I. PRIORITET) te projekte vodoopskrbe i odvodnje od interesa za jedinice lokalne samouprave financirane iz pripadajućeg preostalog dijela naknade za razvoj i ostalih izvora (II. PRIORITET).

U sljedećoj tablici daje se rekapitulacija ulaganja za 2016.g. u gradnju komunalnih vodnih građevina po izvorima financiranja za projekte I. i II. prioriteta.

Tablica 1: REKAPITULACIJA OSTVARENIH ULAGANJA U PROJEKTE I. i II. PRIORITETA PO IZVORIMA FINANCIRANJA ZA 2016. GODINU U USPOREDBI S IZMJENAMA PLANA ZA 2016. GODINU

(u kn bez lipa)

Opis		Izvori financiranja						Ukupan plan financiranja 2016.	
		Naknada za razvoj vodoop. i odvodnje	Naknada za razvoj kan. sus. Grobnik - Klana	Proračun	EU sredstva	Hrvatske vode - Jadranski projekt (zajam, drž. Proračun)	Hrvatske vode		Drugi izvor financiranja (kredit)
1		2	3	4	5	6	7	8	9 (2+3+4+5+6+7+8)
Projekti I. prioriteta	Izmjene Plana 2016.	6.150.370	4.732.784	-	-	200.205	13.912.425	7.954.000	32.949.784
	Ostvarenje 2016.	5.215.343	3.959.895	-	-	200.205	12.538.587	8.486.618	30.400.648
	Indeks	84,8	83,7	-	-	100,0	90,1	106,7	92,3
Projekti II. prioriteta	Izmjene Plana 2016.	16.848.213	-	41.300	-	-	35.477.756	71.741.740	124.109.009
	Ostvarenje 2016.	15.293.857	-	0	12.552.139	-	21.763.405	59.345.585	108.954.986
	Indeks	90,8	-	0,0	-	-	61,3	82,7	87,8
Ukupno projekti I. i II. prioriteta	Izmjene Plana 2016.	22.998.583	4.732.784	41.300	-	200.205	49.390.181	79.695.740	157.058.793
	<b>Ostvarenje 2016.</b>	<b>20.509.200</b>	<b>3.959.895</b>	<b>-</b>	<b>12.552.139</b>	<b>200.205</b>	<b>34.301.992</b>	<b>67.832.203</b>	<b>139.355.634</b>
	Indeks	89,2	83,7	-	-	100,0	69,5	85,1	88,7


U sklopu Operativnog programa "Zaštita okoliša 2007. – 2013." i programa EN 2.1.17 - Financiranje provedbe investicijskih projekata koji se odnose na manje dijelove sustava javne vodoopskrbe/odvodnje - "Male intervencije 2", Društvo je sklopilo 2016. godine ugovore i Prvi dodatak ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava za dva projekta koji su financirani iz strukturnih i Kohezijskog fonda EU:

- EN.2.1.17.-0040 „Izgradnja-rekonstrukcija sanitarne kanalizacije i pratećih vodovoda gradskog područja Gornji Zamet/Zona Z-2 i Z-3, Donja Drenova/sjeverni dio, Murini i rekonstrukcija CS Kostabela s pripadajućim cjevovodima“ – projekt u gradu Rijeci i
- EN.2.1.17.-0043 „Proširenje vodovodne infrastrukture u gradu Kastvu“

Oba su projekta sufinancirana od strane Hrvatskih voda u 90% iznosu tijekom 2015. i 2016. godine temeljem sklopljenih Ugovora o sufinanciranju s Hrvatskim vodama – EIB/CEB program, dok je preostalih 10% sredstava osiguralo Društvo iz naknade za razvoj vodoopskrbe i odvodnje. Sukladno zahtjevu za nadoknadom utrošenih sredstava, EU fondovi su dodjelili bespovratna sredstva za projekt u gradu Rijeci u iznosu od 12.552.139 kn od čega su krajem 2016. godine doznačena sredstva Hrvatskima vodama u iznosu od 11.296.925 kn, a Društvo je ostvarilo povrat sredstava u iznosu od 1.255.214 kn.

Za projekt proširenja vodovodne infrastrukture u gradu Kastvu su EU fondovi dodjelili bespovratna sredstva početkom 2017. godine u iznosu od 3.492.437 kn od čega su Hrvatskim vodama doznačena sredstva u iznosu od 3.263.561 kn, a Društvu povrat sredstava u iznosu od 228.876 kn.

Grafikon 1: UTROŠENA SREDSTVA PO IZVORIMA FINANCIRANJA U PROJEKTE I. I II. PRIORITETA

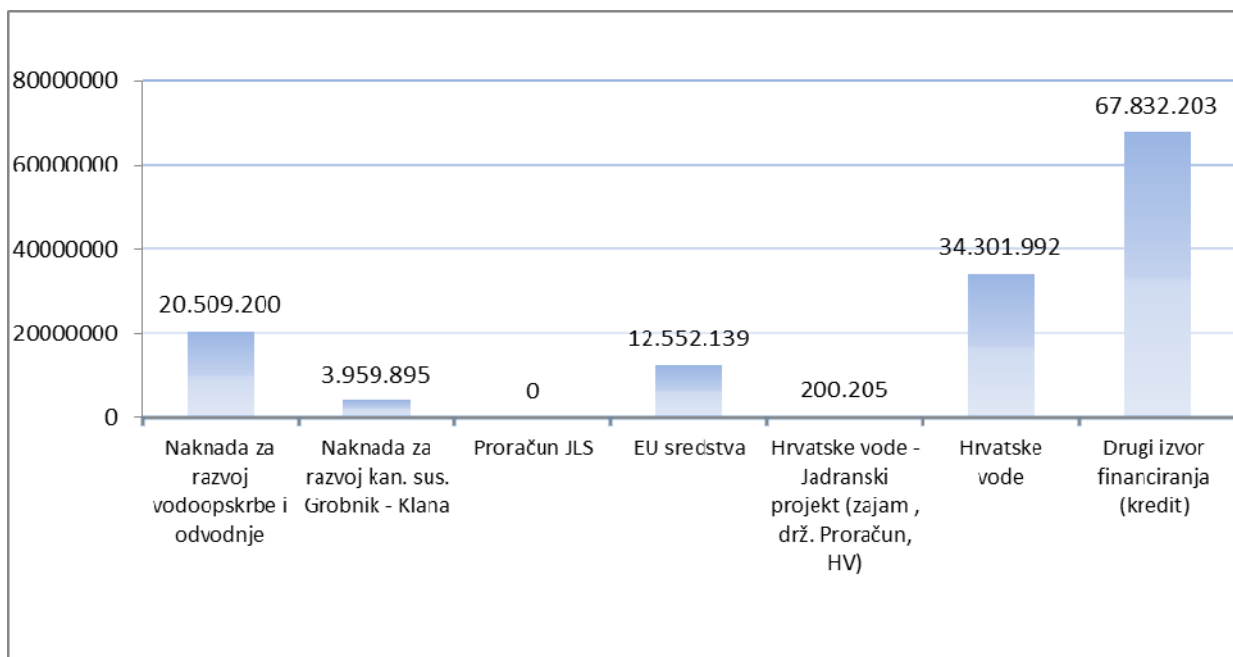

U nastavku se daje pregled utrošenih sredstava naknade za razvoj vodoopskrbe i odvodnje u projekte I. i II. prioriteta te naknade za razvoj kanalizacijskog sustava Grobnik – Klana po jedinicama lokalne samouprave.

Tablica 2: RASPORED UTROŠENIH SREDSTAVA NAKNADE ZA RAZVOJ VODOOPSKRBE I ODVODNJE U PROJEKTE I. I II. PRIORITETA TE NAKNADE ZA RAZVOJ KANALIZACIJSKOG SUSTAVA GROBNIK – KLANA PO JLS ZA 2016. GODINU

(u kn bez lipa)

Jedinica lokalne samouprave	Utrošena sredstva naknade za razvoj u projekte vodoopskrbe i odvodnje			Utrošena sredstva naknade za razvoj Grobnik - Klana	Sveukupno utrošena sredstva naknade
	I. Prioritet	II. Prioritet	Ukupno		
1	2	3	4 (2+3)	5	6 (4+5)
Grad Rijeka	3.497.931	11.037.527	14.535.458	2.627.787	17.163.244
Grad Bakar	222.695	83.452	306.147	172.651	478.799
Grad Kastav	232.604	568.192	800.796	173.047	973.844
Grad Kraljevica	124.125	78.194	202.319	94.642	296.961
Općina Čavle	155.939	0	155.939	116.421	272.360
Općina Jelenje	103.264	33.797	137.061	76.426	213.487
Općina Klana	34.421	433.894	468.315	25.343	493.659
Općina Kostrena	498.065	2.575.252	3.073.317	415.393	3.488.710
Općina Viškovo	346.299	483.549	829.847	258.185	1.088.033
<b>UKUPNO</b>	<b>5.215.343</b>	<b>15.293.857</b>	<b>20.509.200</b>	<b>3.959.895</b>	<b>24.469.095</b>

### 8.1. RAZVOJNI ZAHVATI VODOOPSKRBE I ODVODNJE OTPADNIH VODA OD ZAJEDNIČKOG INTERESA SUVLASNIKA DRUŠTVA I ISPORUČITELJA VODNE USLUGE (I. PRIORITET)

Tablica 3: UTROŠENA SREDSTVA U PROJEKTE I. PRIORITETA U 2016. GODINI U USPOREDBI S IZMJENAMA PLANA ZA 2016. GODINU I VRIJEDNOST IZVRŠENIH RADOVA U 2016. GODINI

(u kn bez lipa)

Točka iz Izmjena plana	Razvojni zahvat	Izmjene plana 2016.	Utrošena / Doznačena sredstva 2016.	Indeks	Izvedeni radovi 2016.
1	2	3	4	5(4/3)	6
<b>8.1.Vodoopskrba</b>					
<b>8.1.1.</b>	<b>Kreditne obveze Marišćina</b> Kreditne obveze su u cijelosti otplaćene.	<b>3.190.000</b>	<b>3.183.730</b>	<b>99,8</b>	-
	naknada za razvoj vodoopskrbe i odvodnje	3.190.000	3.183.730	99,8	
<b>8.1.2.</b>	<b>Vodoopskrba visinske zone Kostrena - nastavak izrade projektne dokumentacije za izgradnju CS i TS Martinšćica sa zahvatima u sklopu vodocrpilišta i priprema za početak gradnje</b>  S obzirom na složenost i sveobuhvatnost razvojnog zahvata vodoopskrbe visinske zone Kostrena, isti se realizira po fazama koje čine funkcionalne cjeline.	<b>30.000</b>	<b>28.995</b>	<b>96,7</b>	<b>28.995</b>
	naknada za razvoj vodoopskrbe i odvodnje	30.000	28.995	96,7	

Točka iz Izmjena plana	Razvojni zahvat	Izmjene plana 2016.	Utrošena / Doznačena sredstva 2016.	Indeks	Izvedeni radovi 2016.
1	2	3	4	5(4/3)	6
<b>8.1.3.</b>	<b>Dogradnja vodoopskrbnog podsustava na području Grobinštine i gradnja podsustava za transport vode na Platak - izrada projektne dokumentacije</b>  Nastavljena je izrada idejne tehničke dokumentacije za ishođenje lokacijskih dozvola za dogradnju vodoopskrbnog podsustava na području Grobinštine i gradnju podsustava za transport vode na Platak, te je započeta izrada glavnih projekata (uključujući troškove imovinsko pravne pripreme), a sve u funkciji vodoopskrbe S.R.C.Platak.	<b>1.335.000</b>	<b>641.310</b>	<b>48,0</b>	<b>796.592</b>
	naknada za razvoj vodoopskrbe i odvodnje	915.000	321.310	35,1	
	Hrvatske vode	420.000	320.000	76,2	
<b>8.1.4.</b>	<b>Gradnja dijela vodoopskrbnog sustava područja Streljana-Kastav-Klana na području gradnje ceste D 427 - III etapa gradnje</b>  Tijekom 2016. godine nastavljeno je polaganje vodovoda u III etapi državne ceste D 427 Marčelji - Mariščina kao dio vodoopskrbnog sustava područja Streljana (Grad Rijeka) – Kastav – Klana čime će se u konačnosti ostvariti spajanje sustava Klana na riječki vodoopskrbni sustav, te poboljšati vodoopskrba šireg područja od Streljane preko Podbrega i Marčelja do Kastva. Radovi su usklađeni s dinamikom izgradnje ceste.	<b>1.475.000</b>	<b>1.338.933</b>	<b>90,8</b>	<b>1.714.415</b>
	naknada za razvoj vodoopskrbe i odvodnje	1.475.000	1.338.933	90,8	
<b>8.2.Odvodnja</b>					
<b>8.2.1.</b>	<b>Kanalizacija Grobnik - kreditne obveze</b> Kreditne obveze se otplaćuju sukladno otplatnom planu (I. i II. tranša).	<b>6.870.000</b>	<b>6.831.466</b>	<b>99,4</b>	-
	naknada za razvoj odvodnje Grobnik - Klana	3.700.000	3.767.111	101,8	
	Hrvatske vode	3.170.000	3.064.355	96,7	
<b>8.2.2.</b>	<b>Kanalizacijski sustav Rijeka-Grobnik – II. faza podprojekta Rijeka-Grobnik</b>  Završeni su radovi po svim potprojektima te su planirana sredstva za podmirenje obveza iz prethodne godine te za pristojbe za uporabne dozvole.	<b>392.989</b>	<b>392.989</b>	<b>100,0</b>	<b>307.895</b>
	naknada za razvoj odvodnje Grobnik - Klana	192.784	192.784	100,0	
	Hrvatske vode Jadranski projekt (zajam, drž. proračun, HV)	200.205	200.205	100,0	

Točka iz Izmjena plana	Razvojni zahvat	Izmjene plana 2016.	Utrošena / Doznačena sredstva 2016.	Indeks	Izvedeni radovi 2016.
1	2	3	4	5(4/3)	6
<b>8.2.3.</b>	<p>Gradnja sanitarnog kolektora u sklopu <b>gradnje 4. faze I. etape te II. i III. etape državne ceste D 427 Čvor Marčelji (nova A7) - Viškovo - Čvor Rujevica (A7)</b></p> <p>Hrvatske ceste kao investitor su izvodile radove na izgradnji državne ceste prema Županijskom centru za gospodarenje otpadom Marišćina, a radovi na izgradnji sanitarnog kolektora su tijekom godine bili usklađeni s dinamikom izgradnje ceste.</p>	<b>2.331.795</b>	<b>1.554.628</b>	<b>66,7</b>	<b>430.457</b>
	naknada za razvoj vodoopskrbe i odvodnje	325.370	216.375	66,5	
	Hrvatske vode	2.006.425	1.338.252	66,7	
<b>8.2.4.</b>	<p><b>Aglomeracija Klana</b> - izrada projektne dokumentacije</p> <p>Za Aglomeraciju Klana (naselja Klana i Studena) je tijekom 2016. godine započela izrada projektne dokumentacije odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda predmetnog područja, te dogradnja postojećeg sustava.</p>	<b>840.000</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>534.289</b>
	naknada za razvoj odvodnje Grobnik - Klana	840.000	0	-	
<b>8.3. Zajednički projekti vodoopskrbe i odvodnje</b>					
<b>8.3.1.</b>	<p><b>EU projekti</b></p> <p><b>AGLOMERACIJA RIJEKA (Rijeka, Kastav, Viškovo, Čavle, Jelenje)</b></p> <p>- dovršetak izrade Studije izvodljivosti i aplikacijski obrazac, ista je u fazi konačne finalizacije sa pripadnim aplikacijskim obrascem i odobrenjem od strane EU, očekuje se u prvoj polovici 2017. godine</p> <p>- dovršetak izrade Studije utjecaja na okoliš sustava Rijeka, ista je završena i dobiveno je rješenje MZOIP da je zahvat prihvatljiv za okoliš uz primjenu zakonom propisanih i rješenjem utvrđenih mjera zaštite okoliša i provedbu programa praćenja stanja okoliša, preostalo je odobrenje zajedničkog aplikacijskog obrasca sa Studijom izvodljivosti od strane EU, očekuje se u prvoj polovici 2017. godine</p> <p>- dovršetak izrade idejnih i glavnih projekata proširenja sustava distribucije, prikupljanja i odvodnje otpadnih voda za područje aglomeracije Rijeka sustav javne odvodnje "Grad"- 2. dio proširenja sustava na području grada Rijeke i grada Kastva te općina Viškovo, Jelenje, Čavle i Matulji, isti su još u fazi provedbe ishodovanja građevinskih dozvola, očekuje se završetak ugovora u prvoj polovici 2017. godine</p> <p>- dovršetak izrade idejnih i glavnih projekata za rekonstrukciju i dogradnju sustava na području aglomeracije Rijeka, sustav javne odvodnje "Grad", isti su još u fazi provedbe ishodovanja građevinskih dozvola, očekuje se završetak ugovora u prvoj polovici 2017. godine</p> <p>- nastavak i dovršetak izrade idejnog projekta UPOV Delta, ugovor proveden, dobivena je lokacijska dozvola, okončanje ugovora u provedbi</p>	<b>16.270.000</b>	<b>16.302.598</b>	<b>100,2</b>	<b>15.260.858</b>

Točka iz Izmjena plana	Razvojni zahvat	Izmjene plana 2016.	Utrošena / Doznačena sredstva 2016.	Indeks	Izvedeni radovi 2016.
1	2	3	4	5(4/3)	6
	<p>- izrada natječajne dokumentacije za gradnju uređaja i mreže, usluge nadzora, nabavu opreme, informiranje i vizibilnost projekta, usluge provedbe projekta. Ista je u provedbi. Očekuje se završetak pripadnih ugovora pripreme natječajne dokumentacije u prvoj polovici 2017. godine.</p> <p><b>AGLOMERACIJA BAKAR – KOSTRENA</b></p> <p>- nastavak i dovršetak izrade Studije izvodljivosti, studije utjecaja na okoliš i aplikacija za EU fondove, ista je u fazi sporazumnog raskida ugovora sa ugovornim izrađivačem s obzirom da je Općina Kostrena izašla iz aglomeracije, započeli su pripreme radnje provedbe aglomeracije Bakar,</p> <p>- projektiranje idejnih projekata sa lokacijskim dozvolama za apliciranje (mreža, CS) i glavnih projekata (mreža, CS) usluge projektiranja nisu ni pokrenute s obzirom na sporazumni raskid ugovora i nemogućnost provedbe</p> <p>- izrada idejnog projekta za ishođenje lokacijske dozvole UPOV Kostrena usluge projektiranja nisu ni pokrenute s obzirom na sporazumni raskid ugovora i nemogućnost provedbe</p> <p><b>AGLOMERACIJA BAKAR</b></p> <p>- izrada koncepcijskog idejnog rješenja sustava prikupljanja, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Bakar (predstudijski dokument) – ugovor započet u prosincu 2016. Godine, te je u provedbi.</p> <p><b>AGLOMERACIJA KRALJEVICA</b></p> <p>- nastavak i dovršetak izrade Studije izvodljivosti, studije utjecaja na okoliš i aplikacija za EU fondove, isto je u fazi provedbe s planiranim produžetkom roka do kraja 2017. godine iz razloga što Grad Kraljevica nije provela izmjene Prostornog plana bitne za izradu i provedbu studijskog dokumenta</p> <p>- projektiranje idejnih projekata sa lokacijskim dozvolama za apliciranje (mreža, CS) i glavnih projekata (mreža, CS, isto se planira pokrenuti u drugoj polovici 2017. godine</p> <p>- izrada idejnog projekta za ishođenje lokacijske dozvole UPOV Kraljevica, isto se planira pokrenuti u drugoj polovici 2017. godine</p> <p>Tijekom 2016. godine se nastavila imovinsko pravna priprema za gradnju dogradnju sustava.</p>				
	Hrvatske vode	8.316.000	7.815.980	94,0	
	drugi izvor financiranja	7.954.000	8.486.618	106,7	



Točka iz Izmjena plana	Razvojni zahvat	Izmjene plana 2016.	Utrošena / Doznačena sredstva 2016.	Indeks	Izvedeni radovi 2016.
1	2	3	4	5(4/3)	6
8.3.2.	<b>EU projekt</b>				
	- <b>transportni kolektor K1 sa rekonstrukcijom dijela postojeće kanalizacije i vodovoda na cesti D8 dionica Krešimirova ulica -priprema dokumentacije i gradnja</b> Projekt je u fazi ishodovanja građevinske dozvole, a aktivirati će se uz rekonstrukciju prometnica Krešimirova, Trpimirova. Natječaj se pokreće preko HC i isti se namjerava pokrenuti u drugoj polovici 2017. godine.				
	- <b>gradnja na dijelu transportnog kolektora u Zametskoj ulici</b> – graditi će se prilikom provedbe ugovora za kompletne EU projekte.				
	- <b>izvođenje dijela fekalne kanalizacije i rekonstrukcije vodovoda u sklopu izgradnje kružnog raskrižja Marinići 2</b> dio je projekata:„Proširenje sustava distribucije, prikupljanja i odvodnje otpadnih voda za područje aglomeracije Rijeka, Sustav javne odvodnje „Grad“, 2. Dio proširenja sustava na području Općine Viškovo, naselje Viškovo 1-3 i naselje Marinići 3-4-5“. Zbog sanacije raskrižja, a u zoni obuhvata istog, započeta je izvedba predmetnih instalacija.	<b>215.000</b>	<b>126.000</b>	<b>58,6</b>	<b>126.000</b>
	- <b>kolektor sanitarnih otpadnih voda u sklopu rekonstrukcije raskrižja Škurinjska draga</b> dio je projekata:„Rekonstrukcija i dogradnja sustava odvodnje otpadnih voda na području aglomeracije Rijeka – transportni kolektori područja Škurinje (kolektori S1 i S2), područja Viškovo (kolektori V1 i V2) i crpna stanica CS Škurinje“. Zbog sanacije raskrižja, a u zoni obuhvata započeta je izvedba predmetnih instalacija.				
	naknada za razvoj vodoopskrbe i odvodnje	215.000	126.000	58,6	
	<b>Izvori financiranja:</b>				
	naknada za razvoj vodoopskrbe i odvodnje	<b>6.150.370</b>	<b>5.215.343</b>	<b>84,8</b>	<b>19.199.500</b>
	naknada za razvoj odvodnje Grobnik - Klana	<b>4.732.784</b>	<b>3.959.895</b>	<b>83,7</b>	
	Hrvatske vode Jadranski projekt	<b>200.205</b>	<b>200.205</b>	<b>100,0</b>	
	Hrvatske vode	<b>13.912.425</b>	<b>12.538.587</b>	<b>90,1</b>	
	drugi izvor financiranja (kredit)	<b>7.954.000</b>	<b>8.486.618</b>	<b>106,7</b>	
	<b>SVEUKUPNO ZA RAZVOJNE ZAHVATE VODOOPSKRBE I ODVODNJE OTPADNIH VODA (I. PRIORITET)</b>	<b>32.949.784</b>	<b>30.400.648</b>	<b>92,3</b>	

## 8.2. ULAGANJA U PROJEKTE VODOOPSKRBE I ODVODNJE OD INTERESA ZA JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE FINANCIRANI IZ PRIPADAJUĆEG PREOSTALOG DIJELA NAKNADE ZA RAZVOJ I OSTALIH IZVORA (II. PRIORITET)

U sljedećim tablicama daje se prikaz utrošenih sredstava u 2016.g. u projekte vodoopskrbe i odvodnje od interesa za svaku jedinicu lokalne samouprave (II. prioritet) po izvorima financiranja i usporedba s Izmjenama i dopunama Plana za 2016.godinu te vrijednost izvršenih radova za 2016. godinu.

Tablica 4: UTROŠENA SREDSTVA U PROJEKTE II. PRIORITETA ZA 2016. GODINU U USPOREDBI S IZMJENAMA PLANA ZA 2016. GODINU I VRIJEDNOST IZVRŠENIH RADOVA U 2016. GODINI ZA **GRAD RIJEKU**

Naziv investicije / Točka iz Izmjene Plana 2016.	Izvori financiranja (u kn bez lipa)										Izvršeni radovi 2016.	
	Naknada za razvoj		EU sredstva		Hrvatske vode		Drugi izvor financiranja (kredit)		Ukupno 2016.			
	Izmjene Plana 2016.	Utrošena sredstva 2016.	Izmjene Plana 2016.	Financiranje 2016.	Izmjene Plana 2016.	Doznačena sredstva 2016.	Izmjene Plana 2016.	Doznačena sredstva 2016.	Izmjene Plana 2016.	Utrošena/ Doznačena sredstva 2016.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10(2+4+6+8)	11(3+5+7+9)	12	
<b>8.5.1. Projekti vodoopskrbe</b>												
1.Vodoopskrba stambenog područja Martinkovac - VS Dražice - priprema dokumentacije za gradnju	60.000	58.092								60.000	58.092	58.092
2.Staro groblje Drenova - projektiranje i gradnja vodovodnog ogranka	26.000	25.210								26.000	25.210	25.210
3.Radnička ulica - projektiranje i gradnja vodovodnog ogranka	9.500	9.500								9.500	9.500	9.500
4.Vodovodni ogranak Bogomira Čikovića Marčeva - tehnički pregled	-	-								-	-	-
5. Vodovodni ogranak Bačići + RS - projektiranje	24.000	20.117								24.000	20.117	20.117
<b>Ukupno za projekte vodoopskrbe</b>	<b>119.500</b>	<b>112.918</b>								<b>119.500</b>	<b>112.918</b>	<b>112.918</b>

Naziv investicije / Točka iz Izmjene Plana 2016.	Izvori financiranja (u kn bez lipa)										Izvršeni radovi 2016.
	Naknada za razvoj		EU sredstva		Hrvatske vode		Drugi izvor financiranja (kredit)		Ukupno 2016.		
	Izmjene Plana 2016.	Utrošena sredstva 2016.	Izmjene Plana 2016.	Financiranje 2016.	Izmjene Plana 2016.	Doznačena sredstva 2016.	Izmjene Plana 2016.	Doznačena sredstva 2016.	Izmjene Plana 2016.	Utrošena/ Doznačena sredstva 2016.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10(2+4+6+8)	11(3+5+7+9)	12
<b>8.6.1. Projekti odvodnje</b>											
1.Sanitarna kanalizacija Radićeve ulice - Šetalište Joakima Rakovca – gradnja sanitarne kanalizacije	160.000	151.258							160.000	151.258	59.508
2. CS Brajdica na Pećinama - priprema za gradnju	10.000	-							10.000		
<b>Ukupno za projekte odvodnje</b>	<b>170.000</b>	<b>151.258</b>							<b>170.000</b>	151.258	<b>59.508</b>
<b>8.7.1. Zajednički projekti vodoopskrbe i odvodnje</b>											
1. Financiranje Putem Europske banke za obnovu i razvoj (EBRD) - gradnja, dodatni troškovi vezani uz realizaciju projekta i troškovi kredita - popis projekata u točki 8.2.1.	784.145	784.058			6.153.707	6.153.707	69.567.087	58.046.166	76.504.939	64.983.931	55.256.614
2. Financiranje Hrvatskih voda putem EIB - CEB programa - gradnja i dodatni troškovi vezani uz realizaciju projekta*	2.371.000	2.633.083		12.552.139	15.170.021	3.092.002			17.541.021	18.277.224	15.515.463
3. Priprema dokumentacije, ostali troškovi za dogradnju sustava vodnih građevina i refinanciranje HV	30.000	28.768							30.000	28.768	29.008

Naziv investicije / Točka iz Izmjene Plana 2016.	Izvori financiranja (u kn bez lipa)										Izvršeni radovi 2016.
	Naknada za razvoj		EU sredstva		Hrvatske vode		Drugi izvor financiranja (kredit)		Ukupno 2016.		
	Izmjene Plana 2016.	Utrošena sredstva 2016.	Izmjene Plana 2016.	Financiranje 2016.	Izmjene Plana 2016.	Doznačena sredstva 2016.	Izmjene Plana 2016.	Doznačena sredstva 2016.	Izmjene Plana 2016.	Utrošena/ Doznačena sredstva 2016.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10(2+4+6+8)	11(3+5+7+9)	12
4. Zajednička izgradnja na području Grada Rijeke – gradnja ogranaka vodovoda i kanalizacije u sklopu izgradnje prometnica, uređenja trgova i ostalih javnih površina sukladno prioritetima Grada Rijeke - ulice Riva i Ivana Zajca - praćenje HOPS-a -sanitarna kanalizacija kolno-pristupnog puta na Marinićima - kanalizacija i vodovod u Ulica Kozala - DTK instalacije za upravljanje sustavom vodovoda i kanalizacije - kanalizacija i vodovod kolno pristupnog puta "Branitelji" - Pavlinski trg - Drenova-Streljana-Bok	1.470.000	659.601							1.470.000	659.601	1.091.644
5.Martinkovac - gradnja vodovoda i sanitarne kanalizacije	1.940.000	1.449.274			1.979.000	1.935.704			3.919.000	3.384.977	4.671.465
6.Radna zona <b>Bodulovo</b> - gradnja vodovoda i kanalizacije	-	-									

Naziv investicije / Točka iz Izmjene Plana 2016.	Izvori financiranja (u kn bez lipa)										Izvršeni radovi 2016.
	Naknada za razvoj		EU sredstva		Hrvatske vode		Drugi izvor financiranja (kredit)		Ukupno 2016.		
	Izmjene Plana 2016.	Utrošena sredstva 2016.	Izmjene Plana 2016.	Financiranje 2016.	Izmjene Plana 2016.	Doznačena sredstva 2016.	Izmjene Plana 2016.	Doznačena sredstva 2016.	Izmjene Plana 2016.	Utrošena/ Doznačena sredstva 2016.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10(2+4+6+8)	11(3+5+7+9)	12
7. Obveze po kreditu za Prioritete izgradnje (zajedničke) komunalne infrastrukture Grada Rijeke	5.225.000	5.218.567							5.225.000	5.218.567	-
<b>Ukupno za zajedničke projekte vodoopskrbe i odvodnje</b>	<b>11.820.145</b>	<b>10.773.351</b>		<b>12.552.139</b>	<b>23.302.728</b>	<b>11.181.413</b>	<b>69.567.087</b>	<b>58.046.166</b>	<b>104.689.961</b>	<b>92.553.068</b>	<b>76.564.194</b>
<b>SVEUKUPNO PROJEKTI VODOOPSKRBE I ODVODNJE</b>	<b>12.109.645</b>	<b>11.037.527</b>		<b>12.552.139</b>	<b>23.302.728</b>	<b>11.181.413</b>	<b>69.567.087</b>	<b>58.046.166</b>	<b>104.979.461</b>	<b>92.817.244</b>	<b>76.736.620</b>

\* **Napomena:** Točka 8.7.1.2. obuhvaća gradnju/rekonstrukciju sanitarne kanalizacije i vodovoda na sljedećim investicijskim projektima : Donja Drenova /sjeverni dio, Gornji Zamet/Zona Z-2 , Gornji Zamet/Zona Z-3, Murini i rekonstrukciju CS Kostabela s pripadajućom kanalizacijom. Projekt je sufinanciran od strane Hrvatskih voda u 90% iznosu tijekom 2015. i 2016. godine – EIB/CEB program, dok je preostalih 10% sredstava osiguralo Društvo iz sredstava naknade za razvoj vodoopskrbe i odvodnje. Sukladno zahtjevu za nadoknadom utrošenih sredstava EU fondovi su dodjelili bespovratna sredstva u iznosu od 12.552.139 kn od čega su krajem 2016. godine doznačena sredstva Hrvatskima vodama u iznosu od 11.296.925 kn , a Društvu sredstva u iznosu od 1.255.214 kn.

Tablica 5: UTROŠENA SREDSTVA U PROJEKTE II. PRIORITETA U 2016. GODINI U USPOREDBI S IZMJENAMA PLANA ZA 2016. GODINU I VRIJEDNOST IZVRŠENIH RADOVA U 2016. GODINI ZA **GRAD BAKAR**

Naziv investicije / Točka iz Izmjene Plana 2016.	Izvori financiranja (u kn bez lipa)										Izvršeni radovi 2016.	
	Naknada za razvoj		Proračun		Hrvatske vode		Drugi izvor financiranja (kredit)		Ukupno 2016.			
	Izmjene Plana 2016.	Utrošena sredstva 2016.	Izmjene Plana 2016.	Doznačena sredstva 2016.	Izmjene Plana 2016.	Doznačena sredstva 2016.	Izmjene Plana 2016.	Doznačena sredstva 2016.	Izmjene Plana 2016.	Utrošena/ Doznačena sredstva 2016.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10(2+4+6+8)	11(3+5+7+9)	12	
<b>8.5.2. Projekti vodoopskrbe</b>												
1.Vodoopskrba naselja Melnice u Gradu Bakru - II faza - priprema i početak gradnje	-	-								-	-	-
2.Škrjevo 1- priprema dokumentacije za gradnju vod. ogranka	25.000	23.647								25.000	23.647	25.910
3.Škrjevo naselje - priprema dokumentacije za gradnju vodovodnog ogranka	17.100	17.069								17.100	17.069	19.341
4.Lonja - Hreljin- priprema dokumentacije za gradnju vodovodnog ogranka	16.000	15.992								16.000	15.992	15.992
5.Kukuljanovo 152 (160) - priprema dokumentacije za gradnju vodovodnog ogranka	17.000	15.744								17.000	15.744	15.744
6.Škrjevo - Dumbrava- priprema dokumentacije za gradnju vodovodnog ogranka	11.000	11.000								11.000	11.000	11.000

Naziv investicije / Točka iz Izmjene Plana 2016.	Izvori financiranja (u kn bez lipa)										Izvršeni radovi 2016.
	Naknada za razvoj		Proračun		Hrvatske vode		Drugi izvor financiranja (kredit)		Ukupno 2016.		
	Izmjene Plana 2016.	Utrošena sredstva 2016.	Izmjene Plana 2016.	Doznačena sredstva 2016.	Izmjene Plana 2016.	Doznačena sredstva 2016.	Izmjene Plana 2016.	Doznačena sredstva 2016.	Izmjene Plana 2016.	Utrošena/ Doznačena sredstva 2016.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10(2+4+6+8)	11(3+5+7+9)	12
7. Prijelazni troškovi rojektiranja (ogranci)	-	-							-	-	
<b>Ukupno za projekte vodoopskrbe</b>	<b>86.100</b>	<b>83.452</b>							<b>86.100</b>	<b>83.452</b>	<b>87.987</b>
<b>8.6.2. Projekti odvodnje</b>											
1.Bakarski kanalizacijski kolektor – priprema dokumentacije za gradnju	-	-							-	-	-
<b>Ukupno za projekte odvodnje</b>	<b>-</b>	<b>-</b>							<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>SVEUKUPNO PROJEKTI VODOOPSKRBE I ODVODNJE</b>	<b>86.100</b>	<b>83.452</b>							<b>86.100</b>	<b>83.452</b>	<b>87.987</b>

Tablica 6: UTROŠENA SREDSTVA U PROJEKTE II. PRIORITETA U 2016. GODINI U USPOREDBI S IZMJENAMA PLANA ZA 2016. GODINU I VRIJEDNOST IZVRŠENIH RADOVA U 2016. GODINI ZA **GRAD KASTAV**

Naziv investicije / Točka iz Izmjene Plana 2016.	Izvori financiranja (u kn bez lipa)										Izvršeni radovi 2016.
	Naknada za razvoj		Proračun		Hrvatske vode		Drugi izvor financiranja (kredit)		Ukupno 2016.		
	Izmjene Plana 2016.	Utrošena sredstva 2016.	Izmjene Plana 2016.	Doznačena sredstva 2016.	Izmjene Plana 2016.	Doznačena sredstva 2016.	Izmjene Plana 2016.	Doznačena sredstva 2016.	Izmjene Plana 2016.	Utrošena/ Doznačena sredstva 2016.	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10(2+4+6+8)	11(3+5+7+9)	12
<b>8.5.3. Projekti vodoopskrbe</b>											
1.Donji Turki (Gec) - gradnja vodovodnog ogranka*	11.100	11.089			41.870	41.867			52.970	52.957	24.889
2.Kastav-Klanci - gradnja vodovodnog ogranka*	35.000	34.817			182.100	182.098			217.100	216.915	204.548
3.Kostanj (Jurčiči -Škrliji) - gradnja vodovodnog ogranka*	110.000	112.400			261.910	261.907			371.910	374.307	288.840
4.Donji Spinčiči od kbr.124-126 - gradnja vodovodnog ogranka*	39.900	39.853			216.310	216.308			256.210	256.160	240.313
5.Krajevac - gradnja vodovodnog ogranka*	38.425	38.422			57.215	57.212			95.640	95.633	68.868
6.Šporeri - gradnja vodovodnog ogranka*	47.600	47.601			185.840	185.835			233.440	233.436	180.756
7.Brnčiči 5-9/1 - gradnja vodovodnog ogranka*	44.675	44.671			286.925	286.925			331.600	331.596	319.921
8.Donji Turki - gradnja vodovodnog ogranka*	131.280	131.279			217.730	217.725			349.010	349.005	143.303
9.Brnčiči put Martiči - gradnja vodovodnog ogranka*	74.030	74.023			297.020	297.018			371.050	371.041	287.516



Naziv investicije / Točka iz Izmjene Plana 2016.	Izvori financiranja (u kn bez lipa)										Izvršeni radovi 2016.	
	Naknada za razvoj		Proračun		Hrvatske vode		Drugi izvor financiranja (kredit)		Ukupno 2016.			
	Izmjene Plana 2016.	Utrošena sredstva 2016.	Izmjene Plana 2016.	Doznačena sredstva 2016.	Izmjene Plana 2016.	Doznačena sredstva 2016.	Izmjene Plana 2016.	Doznačena sredstva 2016.	Izmjene Plana 2016.	Utrošena/ Doznačena sredstva 2016.		
	2	3	4	5	6	7	8	9	10(2+4+6+8)	11(3+5+7+9)	12	
10.Prijelazni troškovi projektiranja (ogranci)	-	-								-	-	-
11.Izrada projektne dokumentacije za vodovodne ogranke: - Kudeji-Rupnjak, - Žegoti, - Donji Spinčići 163A-163C - Krajevac Brnčići	-	9.950	41.300	-					41.300	9.950		29.350
<b>Ukupno za projekte vodoopskrbe</b>	<b>532.010</b>	<b>544.105</b>	<b>41.300</b>		<b>1.746.920</b>	<b>1.746.895</b>			<b>2.320.230</b>	<b>2.291.001</b>		<b>1.788.305</b>
<b>8.7.3. Zajednički projekti vodoopskrbe i odvodnje</b>												
1. Sanitarna kanalizacija RZ Žegoti - Šporova jama - Jurčići, I faza - gradnja, dodatni troškovi vezani uz realizaciju projekta i troškovi kredita	22.647	22.617			190.321	190.321	1.440.529	887.786	1.653.497	1.100.724		840.422
2. Kanalizacija naselja Jurčići - Jurjenići - gradnja, dodatni troškovi vezani uz realizaciju projekta	1.500	1.470					734.124	411.633	735.624	413.103		365.874
3. Put Vladimira Nazora u staroj jezgri grada Kastva - gradnja ogranka kanalizacije i vodovoda	9.000	-							9.000	-		9.000

Naziv investicije / Točka iz Izmjene Plana 2016.	Izvori financiranja (u kn bez lipa)										Izvršeni radovi 2016.
	Naknada za razvoj		Proračun		Hrvatske vode		Drugi izvor financiranja (kredit)		Ukupno 2016.		
	Izmjene Plana 2016.	Utrošena sredstva 2016.	Izmjene Plana 2016.	Doznačena sredstva 2016.	Izmjene Plana 2016.	Doznačena sredstva 2016.	Izmjene Plana 2016.	Doznačena sredstva 2016.	Izmjene Plana 2016.	Utrošena/ Doznačena sredstva 2016.	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10(2+4+6+8)	11(3+5+7+9)	12
<b>Ukupno za zajedničke projekte vodoopskrbe i odvodnje</b>	<b>33.147</b>	<b>24.087</b>			<b>190.321</b>	<b>190.321</b>	<b>2.174.653</b>	<b>1.299.419</b>	<b>2.398.121</b>	<b>1.513.827</b>	<b>1.215.296</b>
<b>SVEUKUPNO PROJEKTI VODOOPSKRBE I ODVODNJE</b>	<b>565.157</b>	<b>568.192</b>	<b>41.300</b>		<b>1.937.241</b>	<b>1.937.216</b>	<b>2.174.653</b>	<b>1.299.419</b>	<b>4.718.351</b>	<b>3.804.828</b>	<b>3.003.601</b>

**\*Napomena:** Projekt „Proširenja vodovodne infrastrukture u gradu Kastvu“ koji obuhvaća ogranke : Donji Turki (Gec) , Kastav-Klanci, Kostanj (Jurčići -Škrliji), Donji Spinčići od kbr.124-126, Krajevac, Šporeri, Brnčići 5-9/1, Donji Turki i Brnčići put Martići sufinanciran je od strane Hrvatskih voda u 90% iznosu tijekom 2015. i 2016. godine u sklopu EIB/CEB programa, dok je preostalih 10% sredstava osiguralo Društvo iz naknade za razvoj vodoopskrbe i odvodnje. Sukladno zahtjevu za nadoknadom utrošenih sredstava EU fondovi su početkom 2017. godine dodjelili bespovratna sredstva u iznosu od 3.492.437 kn od čega su Hrvatskim vodama doznačena sredstva u iznosu od 3.263.561 kn , a Društvu sredstva u iznosu od 228.876 kn.

Tablica 7: UTROŠENA SREDSTVA U PROJEKTE II. PRIORITETA U 2016. GODINI U USPOREDBI S IZMJENAMA PLANA ZA 2016. GODINU I VRIJEDNOST IZVRŠENIH RADOVA U 2016. GODINI ZA **GRAD KRALJEVICU**

Naziv investicije / Točka iz Izmjene Plana 2016.	Izvori financiranja (u kn bez lipa)										Izvršeni radovi 2016.
	Naknada za razvoj		Proračun		Hrvatske vode		Drugi izvor financiranja (kredit)		Ukupno 2016.		
	Izmjene Plana 2016.	Utrošena sredstva 2016.	Izmjene Plana 2016.	Doznačena sredstva 2016.	Izmjene Plana 2016.	Doznačena sredstva 2016.	Izmjene Plana 2016.	Doznačena sredstva 2016.	Izmjene Plana 2016.	Utrošena/ Doznačena sredstva 2016.	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (2+4+6+8)	11 (3+5+7+9)	12
<b>8.5.4. Projekti vodoopskrbe</b>											
1. Put za Banj - gradnja vodovodnog ogranka	-	-							-	-	
2. Spojni cjevovod - Banj - nastavak pripreme dokumentacije za gradnju i gradnja vodovodnog ogranka	-	-							-	-	
3.Fara k.br. 1, 2 i 3 i groblje Kraljevica - tehnički pregled	23.700	23.693							23.700	23.693	950
4.Pod Banj - pristupna cesta -priprema dokumentacije za gradnju	48.000								48.000	-	
<b>Ukupno za projekte vodoopskrbe</b>	<b>71.700</b>	<b>23.693</b>							<b>71.700</b>	<b>23.693</b>	<b>950</b>
<b>8.7.4. Zajednički projekti vodoopskrbe i odvodnje</b>											
1.Vodovodna i kanalizacijska mreža <b>Jakovčičeve ulice (dio u cesti)</b> - projektiranje	-	-							-	-	-
2.Vodovodna i kanalizacijska mreža <b>Jakovčičeve ulice - II dio</b> - projektiranje i gradnja	55.000	54.501							55.000	54.501	54.501
<b>Ukupno za zajedničke projekte vodoopskrbe i odvodnje</b>	<b>55.000</b>	<b>54.501</b>							<b>55.000</b>	<b>54.501</b>	<b>54.501</b>
<b>SVEUKUPNO PROJEKTI VODOOPSKRBE I ODVODNJE</b>	<b>126.700</b>	<b>78.194</b>							<b>126.700</b>	<b>78.194</b>	<b>55.451</b>

Tablica 8: UTROŠENA SREDSTVA U PROJEKTE II. PRIORITETA U 2016. GODINI U USPOREDBI S IZMJENAMA PLANA ZA 2016. GODINU I VRIJEDNOST IZVRŠENIH RADOVA U 2016. GODINI ZA **OPĆINU KOSTRENA**

Naziv investicije / Točka iz Izmjene Plana 2016.	Izvori financiranja (u kn bez lipa)										Izvršeni radovi 2016.
	Naknada za razvoj		Proračun		Hrvatske vode		Drugi izvor financiranja (kredit)		Ukupno 2016.		
	Izmjene Plana 2016.	Utrošena sredstva 2016.	Izmjene Plana 2016.	Doznačena sredstva 2016.	Izmjene Plana 2016.	Doznačena sredstva 2016.	Izmjene Plana 2016.	Doznačena sredstva 2016.	Izmjene Plana 2016.	Utrošena/ Doznačena sredstva 2016.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10(2+4+6+8)	11(3+5+7+9)	12
<b>8.5.5. Projekti vodoopskrbe</b>											
1.Vodosprema s hidroforskom stanicom Solin 2 - gradnja	165.000	163.787			205.000	204.054			370.000	367.841	364.344
2. Vodovodni ogranci naselja Glavani - Ledine - Šubati -Raspelje - gradnja	1.403.000	1.241.594			3.600.000	2.944.524			5.003.000	4.186.118	4.716.761
3.Rekonstrukcija i građenje tlačnog vodovodnog cjevovoda CS Martinščica-VS Glavani i tlačno opskrbnog vodovodnog cjevovoda VS Glavani - VS Solin, dionica Mažeri-Glavani	802.000	814.761			1.600.000	1.273.185			2.402.000	2.087.946	2.521.869
4.Rekonstrukcija i gradnja tlačnog vodovodnog cjevovoda CS Martinščica-VS Glavani, dionica Martinščica-Mažeri	637.000	355.110			3.100.000	2.763.188			3.737.000	3.118.298	3.454.252
5.Vodoopskrba visinske zone Kostrena: dionica Solin - Sopalj - projektiranje	0								0	0	

Naziv investicije / Točka iz Izmjene Plana 2016.	Izvori financiranja (u kn bez lipa)										Izvršeni radovi 2016.
	Naknada za razvoj		Proračun		Hrvatske vode		Drugi izvor financiranja (kredit)		Ukupno 2016.		
	Izmjene Plana 2016.	Utrošena sredstva 2016.	Izmjene Plana 2016.	Doznačena sredstva 2016.	Izmjene Plana 2016.	Doznačena sredstva 2016.	Izmjene Plana 2016.	Doznačena sredstva 2016.	Izmjene Plana 2016.	Utrošena/ Doznačena sredstva 2016.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10(2+4+6+8)	11(3+5+7+9)	12
6. Sv.Lucija - gradnja vodovodnog ogranka	0				0				0	0	
<b>Ukupno za projekte vodoopskrbe</b>	<b>3.007.000</b>	<b>2.575.252</b>			<b>8.505.000</b>	<b>7.184.950</b>			<b>11.512.000</b>	<b>9.760.203</b>	<b>11.057.225</b>
<b>8.7.5. Zajednički projekti vodoopskrbe i odvodnje</b>											
1. Vodovod i kanalizacija u naselju Doričići - priprema dokumentacije za gradnju i početak gradnje	18.100								18.100	0	0
2.Priprema projektne i ostale dokumentacije za gradnju vodovoda i kanalizacije u Općini Kostrena	0								0	0	0
<b>Ukupno za zajedničke projekte vodoopskrbe i odvodnje</b>	<b>18.100</b>	<b>0</b>							<b>18.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>SVEUKUPNO PROJEKTI VODOOPSKRBE I ODVODNJE</b>	<b>3.025.100</b>	<b>2.575.252</b>	<b>0</b>		<b>8.505.000</b>	<b>7.184.950</b>	<b>0</b>		<b>11.530.100</b>	<b>9.760.203</b>	<b>11.057.225</b>

Tablica 9: UTROŠENA SREDSTVA U PROJEKTE II. PRIORITETA U 2016. GODINI U USPOREDBI S IZMJENAMA PLANA ZA 2016. GODINU I VRIJEDNOST IZVRŠENIH RADOVA U 2016. GODINI ZA **OPĆINU ČAVLE**

Naziv investicije / Točka iz Izmjene Plana 2016.	Izvori financiranja (u kn bez lipa)										Izvršeni radovi 2016.	
	Naknada za razvoj		Proračun		Hrvatske vode		Drugi izvor financiranja (kredit)		Ukupno 2016.			
	Izmjene Plana 2016.	Utrošena sredstva 2016.	Izmjene Plana 2016.	Doznačena sredstva 2016.	Izmjene Plana 2016.	Doznačena sredstva 2016.	Izmjene Plana 2016.	Doznačena sredstva 2016.	Izmjene Plana 2016.	Utrošena/ Doznačena sredstva 2016.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10(2+4+6+8)	11(3+5+7+9)	12	
<b>8.5.6. Projekti vodoopskrbe</b>												
1.Soboli 2 – produženje - priprema dokumentacije za gradnju vodovodnog ogranka	0									0	0	0
2.Soboli 3 – priprema dokumentacije za gradnju vodovodnog ogranka	0									0	0	0
<b>Ukupno za projekte vodoopskrbe</b>	<b>0</b>									<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Tablica 10: UTROŠENA SREDSTVA U PROJEKTE II. PRIORITETA U 2016. GODINI U USPOREDBI S IZMJENAMA PLANA ZA 2016. GODINU I VRIJEDNOST IZVRŠENIH RADOVA U 2016. GODINI ZA **OPĆINU VIŠKOVO**

Naziv investicije / Točka iz Izmjene Plana 2016.	Izvori financiranja (u kn bez lipa)										Izvršeni radovi 2016.
	Naknada za razvoj		Proračun		Hrvatske vode		Drugi izvor financiranja (kredit)		Ukupno 2016.		
	Izmjene Plana 2016.	Utrošena sredstva 2016.	Izmjene Plana 2016.	Doznačena sredstva 2016.	Izmjene Plana 2016.	Doznačena sredstva 2016.	Izmjene Plana 2016.	Doznačena sredstva 2016.	Izmjene Plana 2016.	Utrošena/ Doznačena sredstva 2016.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (2+4+6+8)	11(3+5+7+9)	12
<b>8.5.7. Projekti vodoopskrbe</b>											
1.Donji Jugi - gradnja vodovod. ogranka	0								0	0	0
2.Kosi - gradnja vodovodnog ogranka	58.476	58.476			115.300	115.300			173.776	173.776	7.084
3. Viškovo prema Adriametalu i Mladenici 19 - gradnja vodovodnog ogranka	100.665	100.647			847.487	847.487			948.152	948.135	950.691
4. Gornji Jugi 44/1-44a - gradnja vodovodnog ogranka*	170.000	78.406			770.000	497.039			940.000	575.444	891.936
5.Pogled - Vrtače V2 - gradnja vodovodnog ogranka	1.520	1.520			0				1.520	1.520	2.270
6.Naselje Kliči - gradnja vodovodnog ogranka	23.000				0				23.000	0	3.550
7.Lučići, Zorzići i novi dio Zorzići od k.br.64-70 - gradnja vodovodnog ogranka	0				0				0	0	0

Naziv investicije / Točka iz Izmjene Plana 2016.	Izvori financiranja (u kn bez lipa)										Izvršeni radovi 2016.
	Naknada za razvoj		Proračun		Hrvatske vode		Drugi izvor financiranja (kredit)		Ukupno 2016.		
	Izmjene Plana 2016.	Utrošena sredstva 2016.	Izmjene Plana 2016.	Doznačena sredstva 2016.	Izmjene Plana 2016.	Doznačena sredstva 2016.	Izmjene Plana 2016.	Doznačena sredstva 2016.	Izmjene Plana 2016.	Utrošena/ Doznačena sredstva 2016.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (2+4+6+8)	11(3+5+7+9)	12
8.Garići - Petrolejska - gradnja vodovodnog ogranka	3.450	3.450							3.450	3.450	3.269
9.Perčevo- gradnja vodovodnog ogranaka	25.000	24.857							25.000	24.857	21.197
10.Vozišće k.br.48-61 - gradnja vodovodnog ogranka	3.230	3.230							3.230	3.230	0
11.Ronjgi - gradnja vodovodnog ogranaka	4.700	4.650							4.700	4.650	4.650
12.Trtni - Juraši - gradnja vodovodnog ogranka	8.200	8.145							8.200	8.145	8.145
13. Juraši NN - priprema dokumentacije za gradnju vodovodnog ogranka	6.000	4.752							6.000	4.752	5.268
14.Bujki 1-47 - priprema dokumentacije za gradnju vodovodnog ogranka	3.500	286							3.500	286	7.795
15.Bujki k.br. 18 – 23 - priprema dokumentacije za gradnju vodovodnog ogranka	0								0	0	0



Naziv investicije / Točka iz Izmjene Plana 2016.	Izvori financiranja (u kn bez lipa)										Izvršeni radovi 2016.
	Naknada za razvoj		Proračun		Hrvatske vode		Drugi izvor financiranja (kredit)		Ukupno 2016.		
	Izmjene Plana 2016.	Utrošena sredstva 2016.	Izmjene Plana 2016.	Doznačena sredstva 2016.	Izmjene Plana 2016.	Doznačena sredstva 2016.	Izmjene Plana 2016.	Doznačena sredstva 2016.	Izmjene Plana 2016.	Utrošena/ Doznačena sredstva 2016.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (2+4+6+8)	11(3+5+7+9)	12
16.Biškupi - priprema dokumentacije za gradnju vodovodnog ogranka	3.500	3.500							3.500	3.500	3.702
17.Juraši - priprema dokumentacije za gradnju vodovodnog ogranka	6.800	6.800							6.800	6.800	6.800
18.Bezjaki - priprema dokumentacije za gradnju vodovodnog ogranka	5.500	5.450							5.500	5.450	5.450
19.Marinići - priprema dokumentacije za gradnju vodovodnog ogranka	6.300	2.805							6.300	2.805	2.805
20.Furićevo 62 ABCD - priprema dokumentacije za gradnju vodovodnog ogranka	12.000	8.765							12.000	8.765	11.076
21.Marinići 29d - priprema dokumentacije za gradnju vodovodnog ogranka	10.000	5.238							10.000	5.238	5.238
22.Blažići - priprema dokumentacije za gradnju vodovodnog ogranka	3.450	3.450							3.450	3.450	2.700

Naziv investicije / Točka iz Izmjene Plana 2016.	Izvori financiranja (u kn bez lipa)										Izvršeni radovi 2016.
	Naknada za razvoj		Proračun		Hrvatske vode		Drugi izvor financiranja (kredit)		Ukupno 2016.		
	Izmjene Plana 2016.	Utrošena sredstva 2016.	Izmjene Plana 2016.	Doznačena sredstva 2016.	Izmjene Plana 2016.	Doznačena sredstva 2016.	Izmjene Plana 2016.	Doznačena sredstva 2016.	Izmjene Plana 2016.	Utrošena/ Doznačena sredstva 2016.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (2+4+6+8)	11(3+5+7+9)	12
23.Marinići 140-142 a - priprema dokumentacije za gradnju vodovodnog ogranka	12.000	4.670							12.000	4.670	4.670
24.Bezjaki 19-24 - priprema dokumentacije za gradnju vodovodnog ogranka	12.000	8.800							12.000	8.800	13.050
25.Vrtače - Kosi - priprema dokumentacije za gradnju vodovodnog ogranka	38.000	37.152							38.000	37.152	1.152
26.Donji Sroki - priprema dokumentacije za gradnju vodovodnog ogranka	7.000	722							7.000	722	722
27.Dovičići - priprema dokumentacije za gradnju vodovodnog ogranka	0	101							0	101	101
28.Dovičići II - priprema dokumentacije za gradnju vodovodnog ogranka	2.500	2.500							2.500	2.500	2.500
29.Stupari kod 40 - priprema	3.000	2.800							3.000	2.800	2.800

Naziv investicije / Točka iz Izmjene Plana 2016.	Izvori financiranja (u kn bez lipa)										Izvršeni radovi 2016.
	Naknada za razvoj		Proračun		Hrvatske vode		Drugi izvor financiranja (kredit)		Ukupno 2016.		
	Izmjene Plana 2016.	Utrošena sredstva 2016.	Izmjene Plana 2016.	Doznačena sredstva 2016.	Izmjene Plana 2016.	Doznačena sredstva 2016.	Izmjene Plana 2016.	Doznačena sredstva 2016.	Izmjene Plana 2016.	Utrošena/ Doznačena sredstva 2016.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (2+4+6+8)	11(3+5+7+9)	12
dokumentacije za gradnju vodovodnog ogranka											
30.Stupari kod 33 - priprema dokumentacije za gradnju vodovodnog ogranka	6.210	6.205							6.210	6.205	6.205
31.Stupari - Straža - priprema dokumentacije za gradnju vodovodnog ogranka	4.000	3.800							4.000	3.800	4.099
32.Marčelji 100 - priprema dokumentacije za gradnju vodovodnog ogranka	87.300	88.025							87.300	88.025	87.905
33.Prijelazni troškovi projektiranja	4.400	4.347							4.400	4.347	7.175
<b>Ukupno za projekte vodoopskrbe</b>	<b>631.701</b>	<b>483.549</b>			<b>1.732.787</b>	<b>1.459.826</b>			<b>2.364.488</b>	<b>1.943.375</b>	<b>2.074.003</b>

\***Napomena:** Pri gradnji vodovodnog ogranaka Gornji Jugi 44/1-44a ( točka 8.5.7.4.) bilo je potrebno izvršiti i radove na odvodnji koji su iz naknade za razvoj vodoopskrbe i odvodnje plaćeni u iznosu od 2.410 kn , a Hrvatske vode su predmetne radove sufinancirale u iznosu od 263.585 kn. Vrijednost izvršenih radova na odvodnji iznosi 420.663 kn.

Tablica 11: UTROŠENA SREDSTVA U PROJEKTE II. PRIORITETA U 2016. GODINI U USPOREDBI S IZMJENAMA PLANA ZA 2016. GODINU I VRIJEDNOST IZVRŠENIH RADOVA U 2016. GODINI ZA **OPĆINU JELENJE**

Naziv investicije / Točka iz Izmjene Plana 2016.	Izvori financiranja (u kn bez lipa)										Izvršeni radovi 2016.
	Naknada za razvoj		Proračun		Hrvatske vode		Drugi izvor financiranja (kredit)		Ukupno 2016.		
	Izmjene Plana 2016.	Utrošena sredstva 2016.	Izmjene Plana 2016.	Doznačena sredstva 2016.	Izmjene Plana 2016.	Doznačena sredstva 2016.	Izmjene Plana 2016.	Doznačena sredstva 2016.	Izmjene Plana 2016.	Utrošena/ Doznačena sredstva 2016.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10(2+4+6+8)	11(3+5+7+9)	12
<b>8.5.8. Projekti vodoopskrbe</b>											
1.Linčetovo - pripreme dokumentacije za gradnju i gradnja vodovodnog ogranka	4.200	4.190							4.200	4.190	4.190
2.Podkilavačka i Težačka II faza - priprema dokumentacije za gradnju vodovodnog ogranka	13.000	13.000							13.000	13.000	13.000
3.Planinska 51 - 52 - priprema dokumentacije za gradnju vodovodnog ogranka	9.000	9.000							9.000	9.000	9.000
4.Prijelazni troškovi projektiranja	7.610	7.607							7.610	7.607	5.337
<b>Ukupno za projekte vodoopskrbe</b>	<b>33.810</b>	<b>33.797</b>							<b>33.810</b>	<b>33.797</b>	<b>31.527</b>

Tablica 12: UTROŠENA SREDSTVA U PROJEKTE II. PRIORITETA U 2016. GODINI U USPOREDBI S IZMJENAMA PLANA ZA 2016. GODINU I VRIJEDNOST IZVRŠENIH RADOVA U 2016. GODINI ZA **OPĆINU KLANA**

Naziv investicije / Točka iz Izmjena Plana 2016.	Izvori financiranja (u kn bez lipa)											
	Naknada za razvoj		Proračun		Hrvatske vode		Drugi izvor financiranja (kredit)		Ukupno 2016.		Izvršeni radovi 2016.	
	Izmjene Plana 2016.	Utrošena sredstva 2016.	Izmjene Plana 2016.	Doznačena sredstva 2016.	Izmjene Plana 2016.	Doznačena sredstva 2016.	Izmjene Plana 2016.	Doznačena sredstva 2016.	Izmjene Plana 2016.	Utrošena/ Doznačena sredstva 2016.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10(2+4+6+8)	11(3+5+7+9)	12	
<b>8.5.9. Projekti vodoopskrbe</b>												
1. Poslovna zona Škalnica - gradnja vodovodnog ogranka	270.000	433.894								270.000	433.894	495.352
<b>Ukupno za projekte vodoopskrbe</b>	<b>270.000</b>	<b>433.894</b>								<b>270.000</b>	<b>433.894</b>	<b>495.352</b>

Tablica 13: REKAPITULACIJA UTROŠENIH SREDSTAVA PO IZVORIMA FINANCIRANJA U PROJEKTE VODOOPSKRBE I ODVODNJE II. PRIORITETA U 2016. GODINI U USPOREDBI S IZMJENAMA PLANA ZA 2016. GODINU I IZVRŠENI RADOVI U 2016. GODINE ZA SVAKU JLS

*(u kn bez lipa)*

Grad/ Općina	Naziv investicije	Naknada za razvoj		EU sredstva		Proračun		Hrvatske vode		Drugi izvor financiranja (kredit)		Ukupno 2016.		Izvršeni radovi 2016.
		Izmjene Plana 2016.	Utrošena sredstva 2016.	Izmjene Plana 2016.	Financiranje 2016.	Izmjene Plana 2016.	Doznačena sredstva 2016.	Izmjene Plana 2016.	Doznačena sredstva 2016.	Izmjene Plana 2016.	Doznačena sredstva 2016.	Izmjene Plana 2016.	Utrošena/ Doznačena sredstva 2016.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 (3+5+7+9+11)	14 (4+6+8+10+12)	15
Rijeka	Ukupno projekti vodoopskrbe i odvodnje	12.109.645	11.037.527	-	12.552.139	-	-	23.302.728	11.181.413	69.567.087	58.046.166	104.979.461	92.817.244	76.736.620
Bakar	Ukupno projekti vodoopskrbe i odvodnje	86.100	83.452	-	-	-	-	-	-	-	-	86.100	83.452	87.987
Kastav	Ukupno projekti vodoopskrbe	565.157	568.192	-	-	41.300	-	1.937.241	1.937.216	2.174.653	1.299.419	4.718.351	3.804.828	3.003.601
Kraljevica	Ukupno projekti vodoopskrbe	126.700	78.194	-	-	-	-	-	-	-	-	126.700	78.194	55.451
Kostrena	Ukupno projekti vodoopskrbe i odvodnje	3.025.100	2.575.252	-	-	-	-	8.505.000	7.184.950	-	-	11.530.100	9.760.203	11.057.225
Čavle	Ukupno projekti vodoopskrbe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Viškovo	Ukupno projekti vodoopskrbe	631.701	483.549	-	-	-	-	1.732.787	1.459.826	-	-	2.364.488	1.943.375	2.074.003
Jelenje	Ukupno projekti vodoopskrbe	33.810	33.797	-	-	-	-	-	-	-	-	33.810	33.797	31.527
Klana	Ukupno projekti vodoopskrbe	270.000	433.894	-	-	-	-	-	-	-	-	270.000	433.894	495.352
<b>SVEUKUPNO PROJEKTI VODOOPSKRBE I ODVODNJE</b>		<b>16.848.213</b>	<b>15.293.857</b>	<b>-</b>	<b>12.552.139</b>	<b>41.300</b>	<b>-</b>	<b>35.477.756</b>	<b>21.763.405</b>	<b>71.741.740</b>	<b>59.345.585</b>	<b>124.109.009</b>	<b>108.954.986</b>	<b>93.541.765</b>

## 8.2.1. FINANCIRANJE RAZVOJNIH ZAHVATA VODOOPSKRBE I ODVODNJE OTPADNIH VODA PUTEM EUROPSKE BANKE ZA OBNOVU I RAZVOJ (EBRD)

Tablica 14: Utrošena sredstva iz EBRD kredita u 2016. godini u usporedbi s Izmjenama plana za 2016. godinu

Red. br.	Naziv projekta	Izmjene Plana ulaganja za 2016. (kredit)	Utrošena sredstva iz EBRD kredita u 2016. godini	Indeks
1	2	3	4	5(4/3)
<b>LOT 1</b>				
1.	IZGRADNJA SANITARNE KANALIZACIJE I IZGRADNJA/REKONSTRUKCIJA VODOVODA PODRUČJE <b>SRDOČI - SJEVER</b>	5.634.905	5.846.745	103,8
2.	IZGRADNJA SANITARNE KANALIZACIJE I IZGRADNJA/REKONSTRUKCIJA VODOVODA PODRUČJE <b>GORNJI ZAMET, ZONA Z1</b>	9.676.660	8.615.527	89,0
<b>LOT 2</b>				
3.	IZGRADNJA SANITARNE KANALIZACIJE I IZGRADNJA/REKONSTRUKCIJA VODOVODA PODRUČJE <b>PEHLIN - MARINIĆI, ZONA P1</b>	14.001.568	11.799.253	84,3
4.	IZGRADNJA SANITARNE KANALIZACIJE I IZGRADNJA/REKONSTRUKCIJA VODOVODA PODRUČJE <b>PEHLIN MARINIĆI, ZONA P2</b>	4.487.507	2.808.553	62,6
5.	IZGRADNJA SANITARNE KANALIZACIJE I IZGRADNJA/REKONSTRUKCIJA VODOVODA PODRUČJE <b>PEHLIN - MARINIĆI, ZONA P3</b>	5.724.895	5.295.525	92,5
<b>LOT 3</b>				
6.	IZGRADNJA SANITARNE KANALIZACIJE I IZGRADNJA/REKONSTRUKCIJA VODOVODA PODRUČJA <b>TIBLJAŠI ŠKURINJE I FAZA</b>	4.019.282	3.262.142	81,2
7.	GRADNJA-REKONSTRUKCIJA SANITARNE KANALIZACIJE I PRATEĆIH VODOVODA PODRUČJA <b>DONJA DRENOVA - JUŽNI DIO</b>	13.026.826	10.050.122	77,1
<b>LOT 4</b>				
8.	GRADNJA-REKONSTRUKCIJA SANITARNE KANALIZACIJE I PRATEĆIH VODOVODA PODRUČJA <b>BRAŠČINE - LUKOVIĆI</b>	6.349.308	4.842.433	76,3
9.	IZGRADNJA SANITARNE KANALIZACIJE I IZGRADNJA/REKONSTRUKCIJA VODOVODA PODRUČJE <b>PULAC</b>	6.646.136	5.525.866	83,1
<b>UKUPNO GRAD RIJEKA: VODOVOD - 12.675,00 m KANALIZACIJA - 24.359,00 m + 1 kanalizacijska crpna stanica, te 678,00 m oborinskog kolektora i 1 upoj radi rekonstrukcije postojećeg mješovitog sustava u razdjelni.</b>		<b>69.567.087</b>	<b>58.046.166</b>	<b>83,4</b>

## SAŽETAK

8. GRADNJA KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA I KORIŠTENJE SREDSTAVA NAKNADE ZA RAZVOJ TE OSTALIH IZVORA FINANCIRANJA				
I. PRIORITET				
Razvojni zahvati	Planirana sredstva (iz svih izvora) po Izmjenama Plana 2016.	Utrošena sredstva (iz svih izvora) ostvarenje 2016.	% realizacija Izmjene Plana 2016.	Izvršeni radovi 2016.
vodoopskrba	6.030.000	5.192.968	86,1	2.540.001
otpadna voda	10.434.784	8.779.082	84,1	1.272.641
zajednički razvojni zahvat vodoopskrbe i otpadne vode	16.485.000	16.428.598	99,7	15.386.858
<b>Ukupno</b>	<b>32.949.784</b>	<b>30.400.648</b>	<b>92,3</b>	<b>19.199.500</b>
II. PRIORITET				
Grad/Općina	Planirana sredstva (iz svih izvora) po Izmjenama Plana 2016.	Utrošena sredstva (iz svih izvora) ostvarenje 2016.	% realizacije Izmjene Plana 2016.	Izvršeni radovi 2016.
Rijeka	104.979.460	92.817.244	88,4	76.736.620
Bakar	86.100	83.452	96,9	87.987
Kastav	4.718.351	3.804.828	80,6	3.003.601
Kraljevica	126.700	78.194	61,7	55.451
Kostrena	11.530.100	9.760.203	84,6	11.057.225
Čavle	0	0	-	0
Viškovo	2.364.488	1.943.375	82,2	2.074.003
Jelenje	33.810	33.797	100,0	31.527
Klana	270.000	433.894	160,7	495.352
<b>Ukupno</b>	<b>124.109.009</b>	<b>108.954.986</b>	<b>87,8</b>	<b>93.541.765</b>
<b>Sveukupno (I. + II. PRIORITET)</b>	<b>157.058.793</b>	<b>139.355.634</b>	<b>88,7</b>	<b>112.741.265</b>
